

**ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LA
FILIERE RIZ**

Hôtel IBIS-Plateau: 7-9 septembre 2004



RAPPORT

NOVEMBRE 2004

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de la préparation de son programme de travail, le FIRCA a décidé d'organiser une large concertation, touchant l'ensemble des acteurs, en vue de procéder à la planification des activités de la filière riz, par la méthode participative. A cet effet et en étroite collaboration avec la filière, il a organisé un atelier de planification du 07 au 9 septembre 2004 à l'Hôtel Ibis Plateau.

Le présent rapport rend compte de la méthodologie de travail utilisée, du déroulement de l'atelier et des résultats obtenus.

2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

L'outil de planification utilisée est la méthode de Planification des Projets par Objectifs (PPO), avec une adaptation des étapes au contexte particulier des objectifs recherchés par le FIRCA.

C'est une méthode participative basée sur les principes de la causalité et du travail en groupes pluridisciplinaires, faisant intervenir dans la réflexion, les personnes ressources directement ou indirectement concernées par le projet.

Ainsi, sous la conduite d'une équipe de Consultants/modérateurs du Cabinet BERGAIN SARL, les participants à l'atelier ont réalisé les différentes étapes suivantes :

- Identification des acteurs de la filière ;
- Analyse des problèmes des producteurs de riz;
- Définition d'une vision commune pour la filière riz ;
- Analyse des objectifs ;
- Elaboration du Cadre Logique à travers :
 - La définition de l'Objectif Global ;
 - La définition de l'Objectif de Développement ;
 - La définition des Objectifs Spécifiques;
 - La définition des Résultats attendus pour chaque Objectif Spécifique ;
 - L'identification des Activités à mener pour atteindre chaque Résultat ;
 - La formulation des Indicateurs Objectivement Vérifiables pour la mesure de l' Objectif Spécifique et des Résultats;
 - La Sélection des actions-projets pour les deux années à venir;
 - L'Elaboration des fiches-projet à partir des actions-projets sélectionnées.

Les travaux se sont déroulés alternativement en séances plénières et en groupes de travail pour les étapes de formulation des indicateurs et d'élaboration des fiches-projets. Les résultats des différents groupes de travail ont été validés à chacune des étapes par l'atelier en séances plénières.

3. LES PARTICIPANTS

Les participants étaient au nombre d'une quinzaine de personnes représentant 11 structures réparties comme suit :

N°	STRUCTURES	Nombre de représentants
	Producteurs et Opérateurs	
1	ANAVI-CI	1
2	COPRORIZ Tiébissou et Yakro	1
3	CORERIZ Katiola	1
4	Union WOWEGNON	2
5	ANARIZ-CI	1
6	Coopérative Grenier Rizicole TIASSALE	2
7	Coopérative Rizicole DALOA	1
	Sous total	9
	Structures de Recherche, de Conseil et Projets	
8	CNRA	2
9	ANADER	1
10	Programme National Riz	1
	Sous total	4
	Administration et Structures Etatiques	
11	MINAGRI	2
	Sous total	2
	TOTAL	15

La modération de l'atelier de planification a été assurée par Messieurs LORNG Jean-Paul et COULIBALY Abdoulaye du Cabinet BERGAIN SARL.

4. RESULTATS DE L'ATELIER

4.1 Identification et analyse des acteurs de la filière

Outre le FIRCA, l'atelier a identifié 27 acteurs répartis dans les catégories professionnelles suivantes Transformateurs ; OPA ; Etat ; Producteurs ; Consommateurs ; commerçants ; Projets de développement ; Structures d'encadrement ; Institutions de recherche ; Fournisseurs ; Cabinets d'étude ; Producteurs de semence ; Fournisseurs ; Institution de financement.

L'analyse des acteurs a ensuite permis d'identifier:

- Les attentes des uns et des autres ;
- Les acteurs qui devant contribuer au FIRCA par une cotisation
- Les acteurs susceptibles d'apporter un financement au FIRCA sous toutes autre formes.

Les structures cotisantes sont fixées par le décret de création. L'atelier a identifié comme structures potentielles pouvant contribuer au financement du FIRCA, divers bailleurs de fonds et partenaires au développement, des projets spécifiques opérant dans la filière. (Annexe n° 5)

4.2 Analyse des problèmes

L'analyse des problèmes consiste à identifier et à analyser les problèmes et les contraintes des producteurs de riz. Cette identification a porté sur l'ensemble de l'environnement des producteurs, c'est à dire, les problèmes des exploitants individuels, ceux de leurs organisations professionnelles ainsi que les problèmes liés à l'environnement externe dans lequel ils évoluent. Cette analyse a permis d'identifier des liaisons logiques de causes à effets entre les différents problèmes (Annexe 3). Le problème central identifié est le suivant :

« LA FILIERE RIZ LOCAL N'EST PAS RENTABLE »

Les causes directes de ce faible niveau de revenu sont :

- Faiblesse des rendements en paddy
- Difficultés d'accès au financement
- Faible organisation des OPA
- Difficultés de commercialisation

Pour chacune de ces causes directes, les sous-causes ou facteurs expliquant cette situation, ont été définies comme suit :

Faiblesse des rendements en paddy

- Faible niveau de mécanisation
- Conditions pédoclimatiques défavorables
- Difficultés d'accès au matériel végétal performant et adapté
- Faible technicité des producteurs

Difficultés d'accès au financement

- Absence de garantie
- Absence de structures de financement spécialisées

Faible organisation des OPA

- Insuffisance d'organisation des producteurs
- Insuffisance de capacité du personnel et des membres des OPA
- Insuffisance d'esprit associatif

Difficultés de commercialisation

- Coût élevé du transport
- Bas prix de vente du paddy
- Difficultés de transformation du paddy
- Difficultés d'écoulement du riz local

Les principaux effets du problème central « la filière du riz local n'est pas rentable » sont :

- Le revenu des paysans est faible
- La dégradation du niveau de vie des producteurs
- La production nationale est insuffisante

L'ensemble de ses effets a pour conséquence le fait que « l'autosuffisance alimentaire n'est assurée » en côte d'ivoire

4.3 Analyse des objectifs

L'analyse des objectifs consiste à décrire, à partir des problèmes identifiés, les situations futures souhaitées et réalistes, après la résolution des problèmes. Ces situations futures sont appelées Objectifs. L'analyse des objectifs permet de réaliser la hiérarchie des objectifs ou arbre des objectifs. Ainsi, l'objectif principal correspondant au problème central identifié a été formulé comme suit¹ :

« La filière riz local est rentable »

La réalisation de cet objectif passe par la réalisation des sous-objectifs ci-dessous :

- Les rendements en paddy sont améliorés
- L'accès au financement est facilité
- Les OPA sont opérationnelles
- La commercialisation du riz est améliorée

Pour chacun de ces objectifs intermédiaires, l'atelier a également identifié la chaîne des sous – objectifs suivants :

¹ Cette formulation de l'objectif est la description de la situation future atteinte après la résolution des problèmes, les activités identifiées dans les chapitres suivants devant permettre sa réalisation.

Les rendements en paddy sont améliorés

Pour cela, la réalisation des sous-objectifs ci-dessous est nécessaire :

- Le niveau de mécanisation est amélioré
- Les contraintes pédoclimatiques sont levées
- Le matériel végétal performant est accessible
- La technicité des producteurs est améliorée

L'accès au financement est amélioré

- Un fond de garantie est mis en place
- Des structures de financement spécialisées fonctionnelles existent

Les OPA sont opérationnelles

- Les producteurs sont mieux organisés
- Les membres et le personnel des OPA sont opérationnels
- L'esprit associatif est développé

La commercialisation du riz est améliorée

- Les coûts du transport sont abordables
- Le prix de vente du paddy est rémunérateur
- La transformation du paddy est facilitée
- L'écoulement du riz local est amélioré

4.4 Choix des alternatives de programmes

L'arbre global de l'analyse des objectifs (présenté en annexe) a servi de base pour le choix des objectifs qui pourront être poursuivis par le FIRCA, dans le cadre de ses missions et pour l'élaboration de son « cadre logique d'intervention ». Il s'agit de définir les différentes approches issues de l'analyse des objectifs.

Pour la filière riz ***l'approche retenue pour l'élaboration de la stratégie d'intervention du FIRCA se situe dans les domaines de la recherche de moyens d'amélioration du rendement du paddy et du fonctionnement des OPA.*** L'approche commerciale et financière qui n'a pas été retenue tout comme l'aspect relatif au développement de l'esprit associatif. Ces questions dont la résolution ne dépend pas du FIRCA constituent néanmoins des hypothèses importantes (ou facteurs externes) pour le succès de l'ensemble du programme.

4.5 Elaboration du Cadre Logique

La matrice du cadre logique, conformément à la méthode de travail utilisée, permet d'indiquer pourquoi le programme ou projet est entrepris ; quels résultats le projet se propose d'atteindre ; comment le programme ou le projet compte atteindre ces résultats ; quels sont les facteurs externes revêtant de l'importance pour le succès du projet; comment évaluer le succès du projet ; où trouver les données nécessaires à l'évaluation du programme ou du projet et combien coûtera le projet. Ainsi ce cadre logique se compose des éléments ci-dessous :

- ◆ l'Objectif Global
- ◆ l'Objectif de Développement
- ◆ l'Objectif Spécifique
- ◆ les Résultats

- ◆ les Activités
- ◆ les Facteurs Externes ou Hypothèses
- ◆ les Indicateurs Objectivement Vérifiables
- ◆ les Sources de Vérification des Objectifs

Les résultats obtenus pour ces différentes rubriques sont présentés sous-dessous :

4.5.1 Objectif Global

Il évoque l'impact à long terme, au niveau le plus élevé, auquel le projet va contribuer. Sa réalisation n'est donc pas uniquement le fait du projet. L'Objectif Global défini est :

« La filière riz local est rentable »

4.5.2 Objectifs Spécifiques

Dans la méthode de planification considérée, l'on définit un seul objectif spécifique pour chaque cadre logique. Néanmoins, compte tenu du caractère stratégique de la planification, l'atelier a été amené à définir plusieurs Objectifs Spécifiques.

Les objectifs spécifiques constituent la finalité du Plan d'Action. Ce sont les objectifs sur lesquels le FIRCA s'engage pour la période de planification considérée, c'est à dire pour les six prochaines années. Ces objectifs constituent les réponses aux préoccupations des producteurs en vue du développement de la filière Riz.

Les participants ont identifié deux (2) Objectifs Spécifiques qui sont ainsi libellés:

- Les rendements du paddy sont améliorés
- Les OPA sont opérationnelles

Pour atteindre chacun de ces objectifs, il a été nécessaire d'identifier des objectifs intermédiaires qui tiennent compte des différentes catégories de problèmes identifiés. Ces objectifs intermédiaires sont appelés **Résultats** et leur réalisation totale est nécessaire pour arriver à l'Objectif Spécifique pour lequel ils ont été définis.

4.5.3 Résultats

Les résultats sont définis comme des changements descriptibles occasionnés par une relation de cause à effet et par la réalisation d'activités. Ces changements peuvent être à court ou moyen terme.

Les Résultats attendus pour la réalisation de chacun de ces Objectifs Spécifiques identifiés sont :

- **OS 1 : Les rendements du paddy sont améliorés :**
 - La technicité des producteurs est améliorée
 - Le matériel végétal performant est accessible
 - Les contraintes pédoclimatiques sont levées
- **OS 2 : Les OPA sont opérationnelles :**
 - Les membres et le personnel des OPA sont opérationnels

4.5.4 Les Activités

Ce sont les actions nécessaires pour réaliser chaque résultat identifié. (annexe n° 2).

4.5.5 Les Facteurs Externes

Les facteurs externes sont des objectifs dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats prévus dans le Plan, mais dont la responsabilité n'incombe pas directement au FIRCA. Pour la présente planification les domaines des systèmes de financement et de la régulation des prix (voir l'arbre des objectifs) devront être réalisés par d'autres programmes afin de garantir le succès des interventions du FIRCA.

4.5.6 Les Indicateurs

Les indicateurs sont des éléments qui vont permettre de mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats. Les participants ont formulé des indicateurs pour les Objectifs Spécifiques et pour l'ensemble des résultats (identification en groupes restreints).

4.5.7 Le choix des actions-projets et l'élaboration des fiches projets

Un choix prioritaire a été opéré parmi l'ensemble des activités identifiées en vue de l'élaboration du programme de travail des deux prochaines années. A cet effet, des 19 idées – projets après réaménagement, 11 sont ressorties comme des projets prioritaires.

Ces projets identifiés sont :

1. Sélection de variétés résistantes à la sécheresse
2. Sélection de variétés résistantes à la pyriculariose
3. Production de semences améliorées
4. Etablissement d'itinéraires techniques
5. Renforcement du conseil agricole
6. Vulgarisation de nouvelles techniques de production et de conservation
7. Formation des multiplicateurs de semences
8. Appui à la création de coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles
9. Elaboration de plans de développement pour les coopératives
10. Renforcement des capacités du LANADA pour la certification des semences
11. Etude de la structure des coûts

Ce sont ces 11 idées de projets qui ont ensuite fait l'objet de fiches-projets pour l'élaboration du programme opérationnel 2005-2006 (Fiches projet annexe n°6).

5 CONCLUSION

L'atelier, par la qualité des participants et des résultats obtenus, a répondu aux attentes aussi bien du FIRCA que des acteurs de la filière présents.

La suite du processus permettra au FIRCA de soumettre les propositions contenues dans le présent rapport, à la validation de diverses instances. Avec cette validation , le FIRCA disposera du portefeuille de son programme opérationnel 2005-2006 en ce qui concerne la filière Riz .

ANNEXES

Annexe 1 : CADRE LOGIQUE

Stratégie	Indicateurs Objectivement Vérifiables	Sources de vérification	Suppositions Importantes
Objectif Global : La filière riz local est rentable	Le bénéfice net de la variété Z passe de X à Y au bout de trois (3) ans dans toutes les zones de productions		
Objectif Spécifique 1 : Les rendements du Paddy sont améliorés	Augmentation du rendement à l'hectare		La commercialisation est améliorée L'accès au financement est facilité
R1.1 : La technicité des producteurs est améliorée	Nombre de producteurs qui appliquent les techniques préconisées Nombre de producteurs qui respectent les dates clés		Le niveau de mécanisation est amélioré
R1.2 : Le matériel végétal performant est accessible	Baisse de la pression des maladies Le taux de satisfaction des utilisateurs des variétés		Le CTIC est opérationnel (Comité Technique d'Inscription des variétés au Catalogue officiel des variétés végétales)
R1.3 : Les contraintes pédoclimatiques sont levées	La réduction des parcelles abandonnées pour cause de contraintes pédoclimatiques		
Objectif Spécifique 2 : Les OPA sont opérationnelles	Taux de satisfaction des membres des OPA La tenue des réunions statutaires		L'esprit associatif est développé
R2.1 : Les membres et le personnel des OPA sont opérationnels	La tenue des documents de gestion		Les producteurs sont mieux organisés
R 2.2 : La promotion du mouvement coopératif est assurée			

Annexe 2 : ACTIVITES

Objectif spécifique 1 : Les rendements du Paddy sont améliorés

R1.1 : La technicité des producteurs est améliorée

1.1.1. Former les producteurs aux techniques culturales préconisées

1.1.2. Renforcer le Conseil agricole

1.1.3. Former les producteurs à la gestion de l'eau

R.1.2 : Le matériel végétal performant est accessible
--

1.2.1. Assurer la production de matériel végétal de 1 ^{ère} qualité
--

1.2.2. Mettre au point des variétés résistantes à la pyriculariose
--

1.2.3. Mettre au point des variétés résistantes à la panachure jaune
--

1.2.4. Former des multiplicateurs de semences

1.2.5. Renforcer les capacités du LANADA pour la certification des semences

R 1.3 : Les contraintes pédoclimatiques sont levées
--

1.3.1. Mettre au point des variétés tolérantes à la sécheresse
--

1.3.2. Mettre au point des itinéraires spécifiques pour l'amélioration de la fertilité des sols

1.3.3. Etablir un calendrier régionalisé de culture

Objectif spécifique 2 : Les OPA sont opérationnelles

R 2.1 : Les membres et le personnel des OPA sont opérationnels

2.1.1. Former les OPA à la gestion coopérative
--

2.1.2. Former les OPA et leur personnel à la commercialisation
--

2.1.3. Renforcer les capacités du personnel permanent des OPA

2.1.4. Former les dirigeants et les gestionnaires des OPA à l'esprit coopératif


R 2.2 : La promotion du mouvement coopératif est assurée


2.2.1 Faire l'état de la situation actuelle

2.2.2 Elaborer un programme d'appui à la création des groupements coopératifs


2.2.3 Mettre en œuvre un programme de création de coopératives rizicoles
--


**Annexe 3 :
ANALYSE DES PROBLEMES**

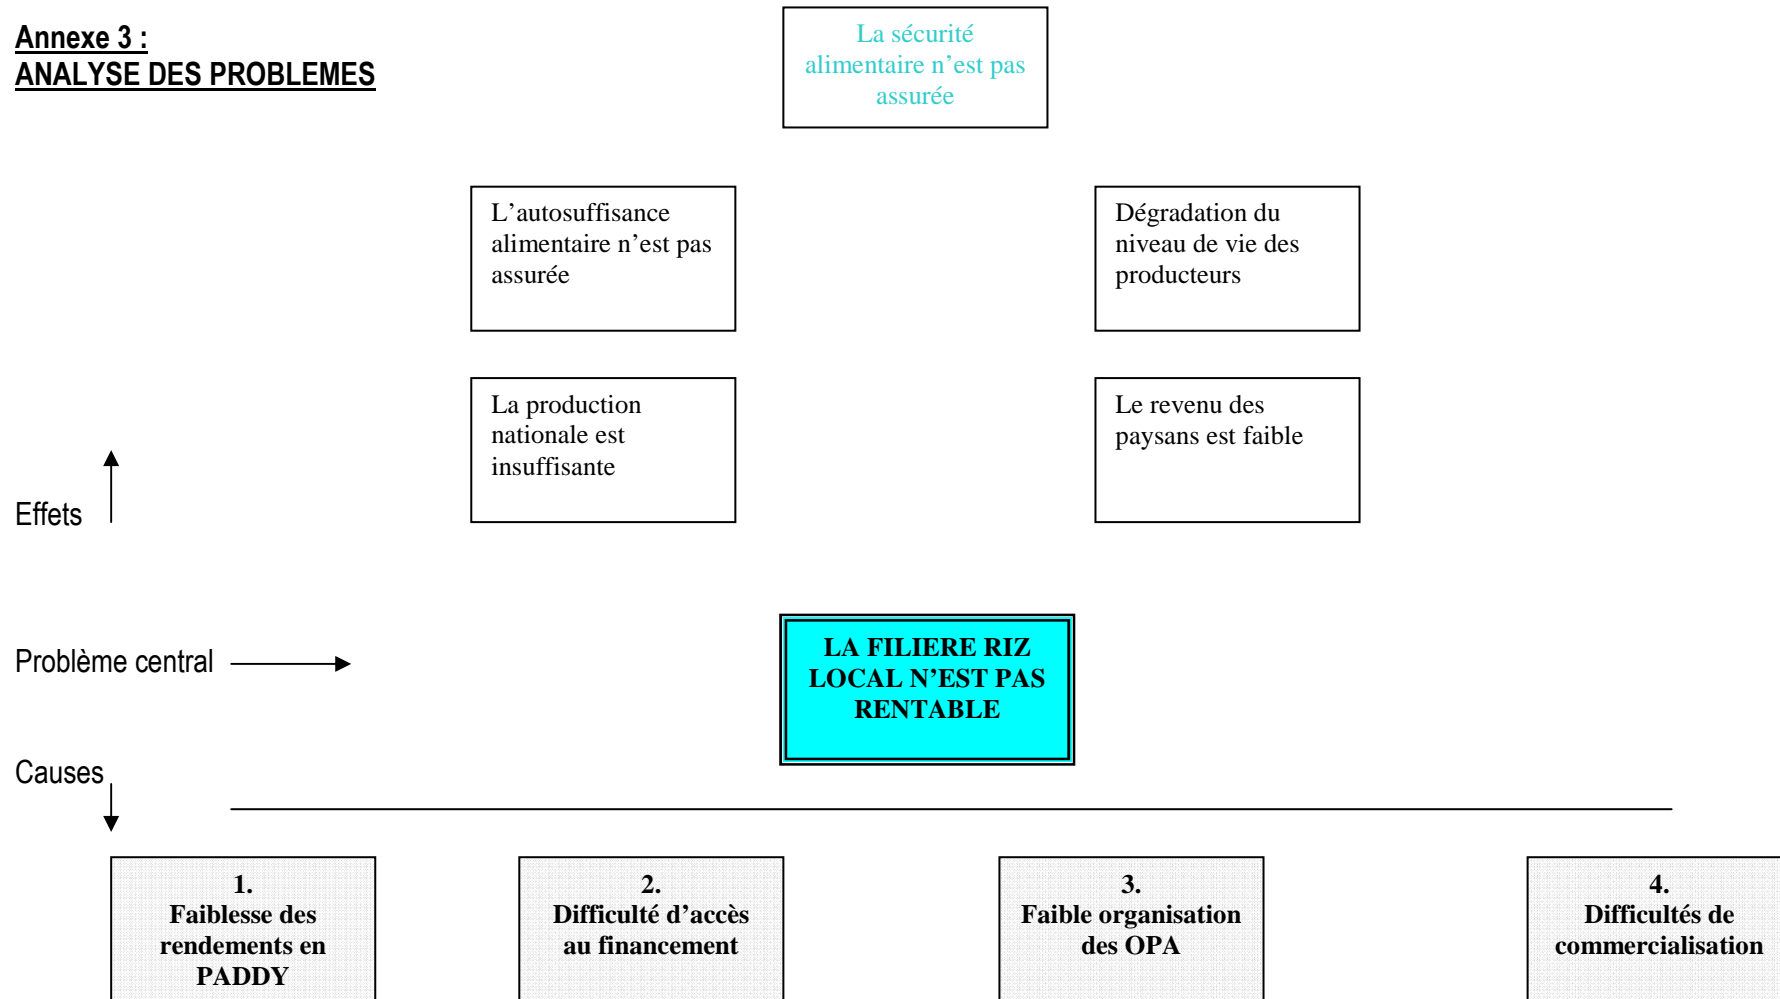

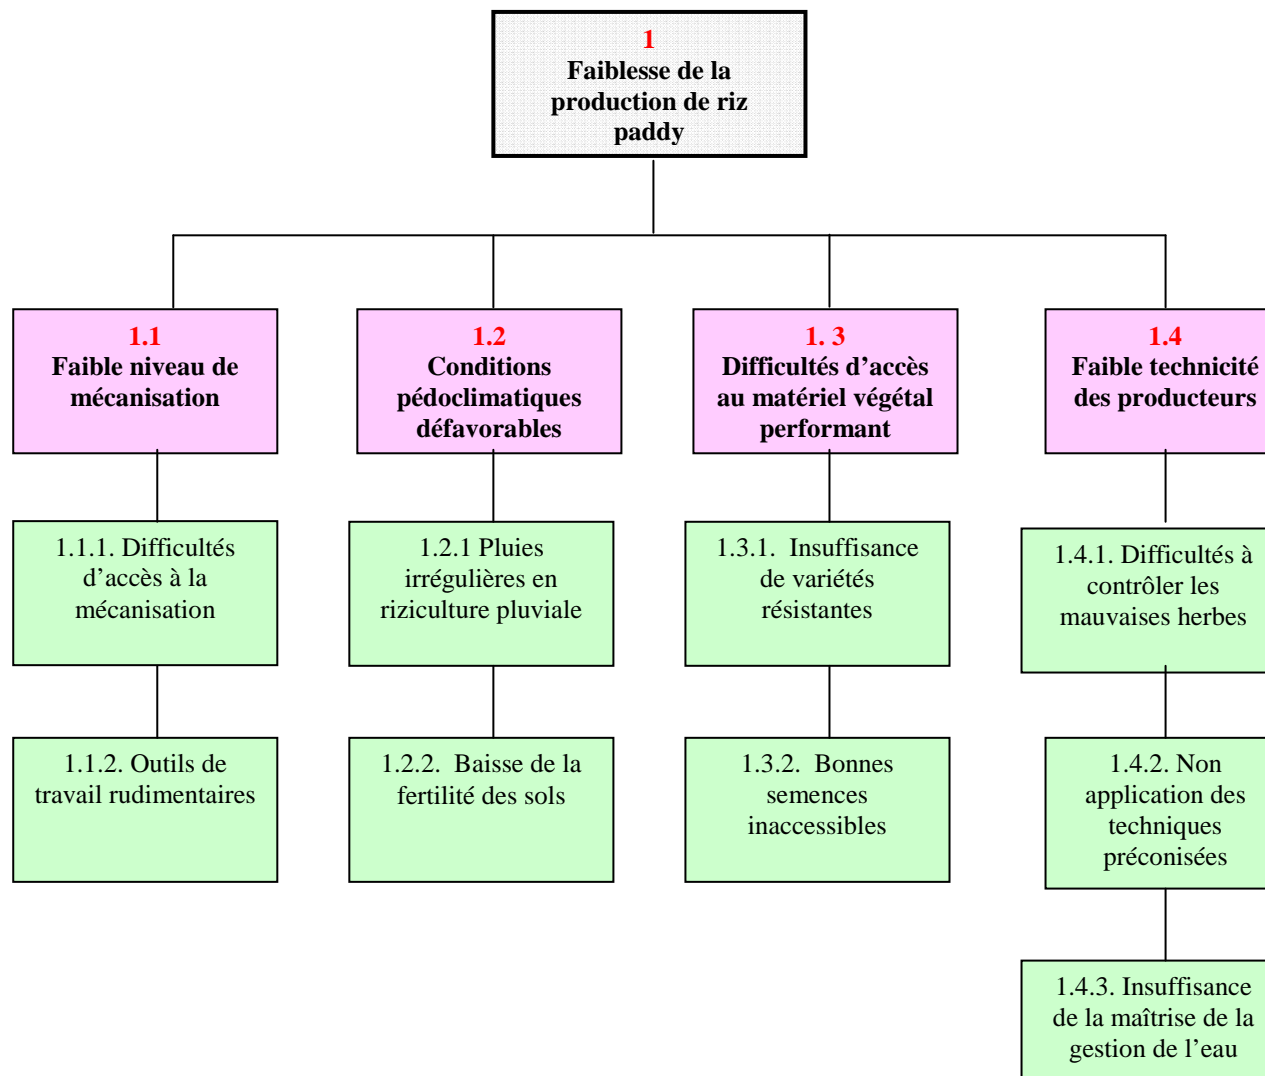


Analyse des problèmes
Sous-causes

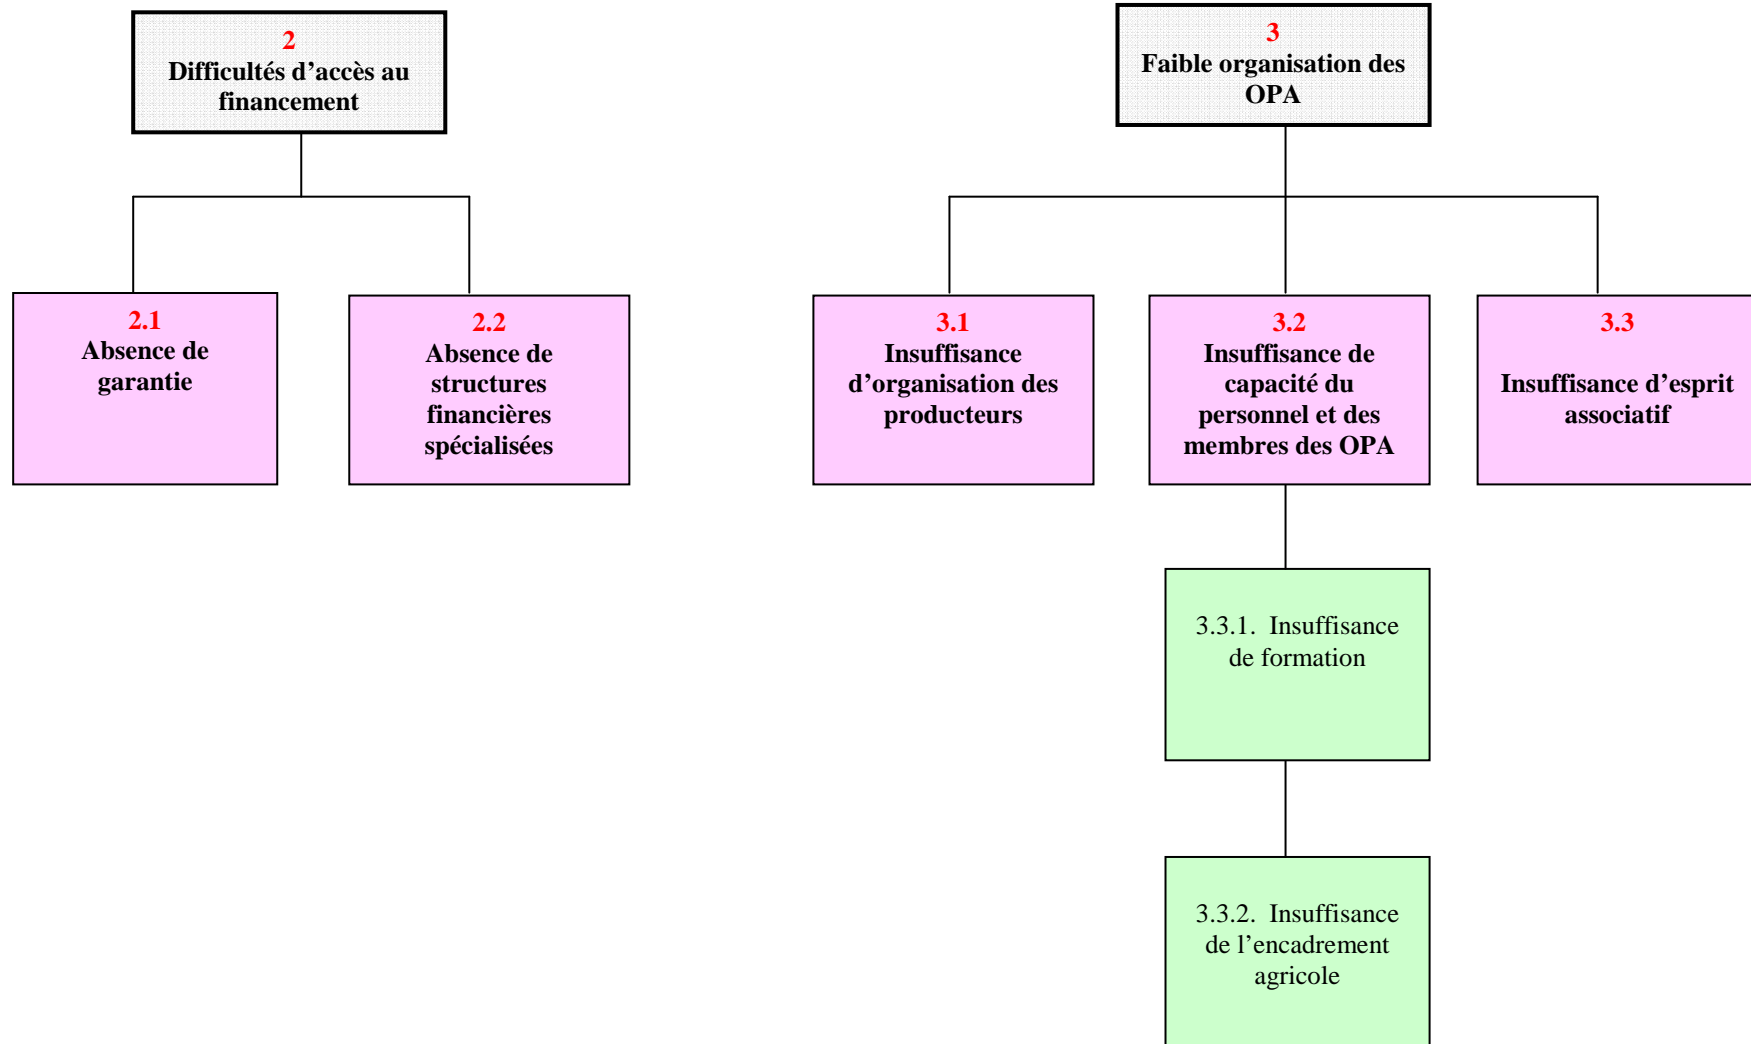


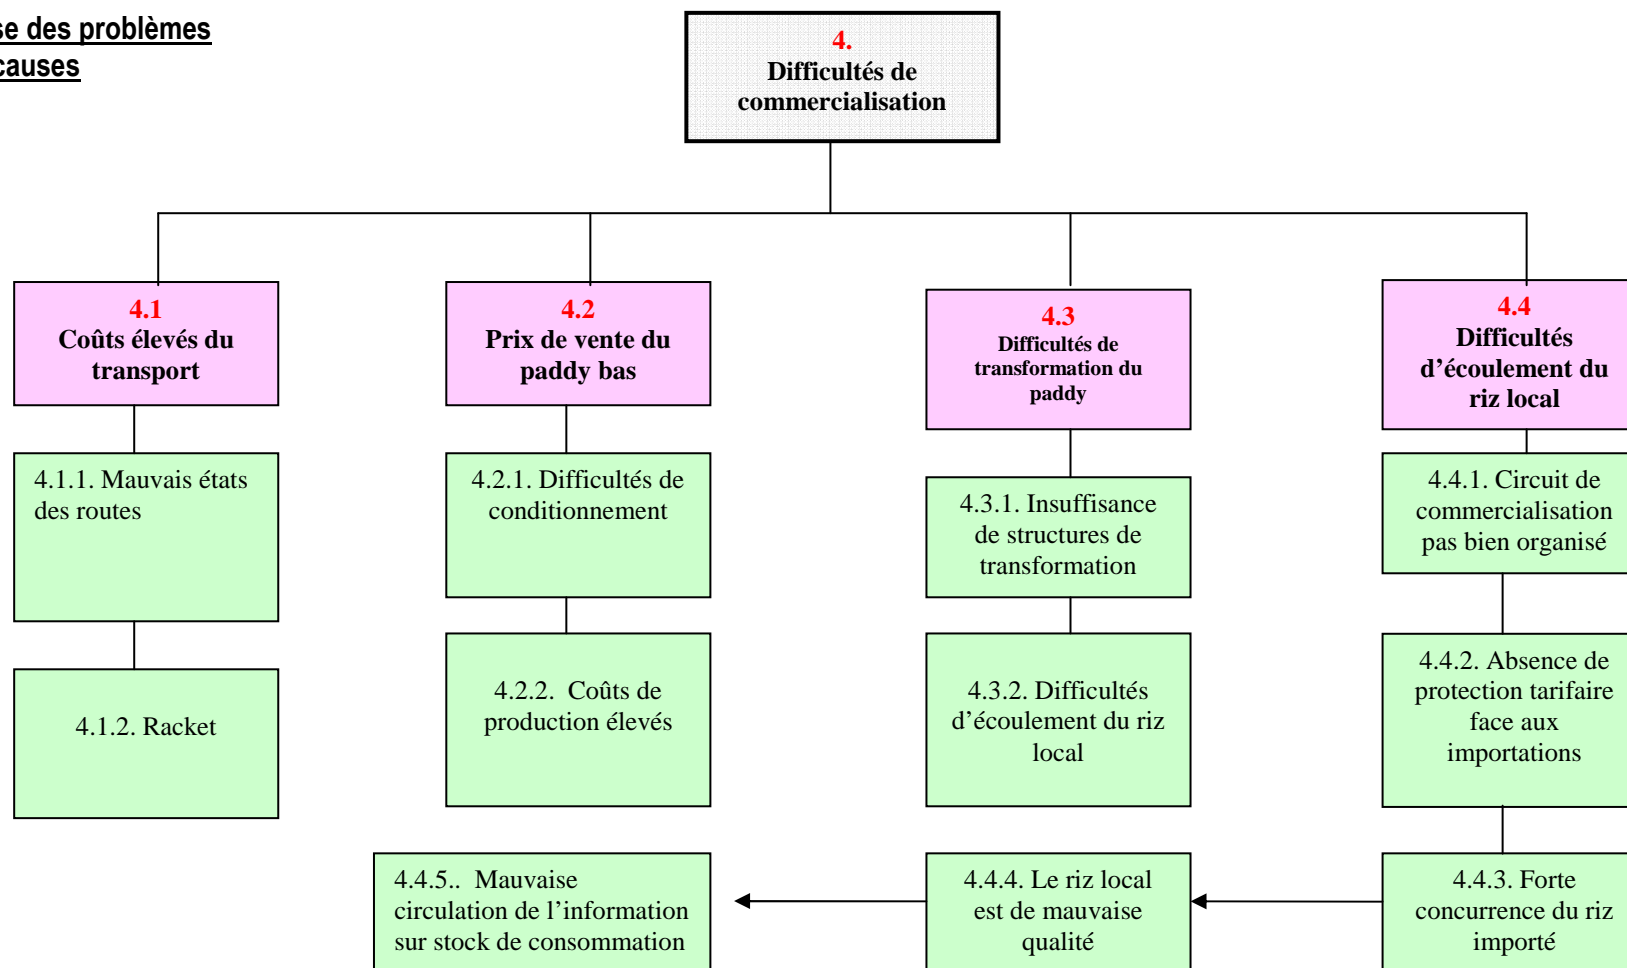


**Annexe 4 :
ANALYSE DES OBJECTIFS**

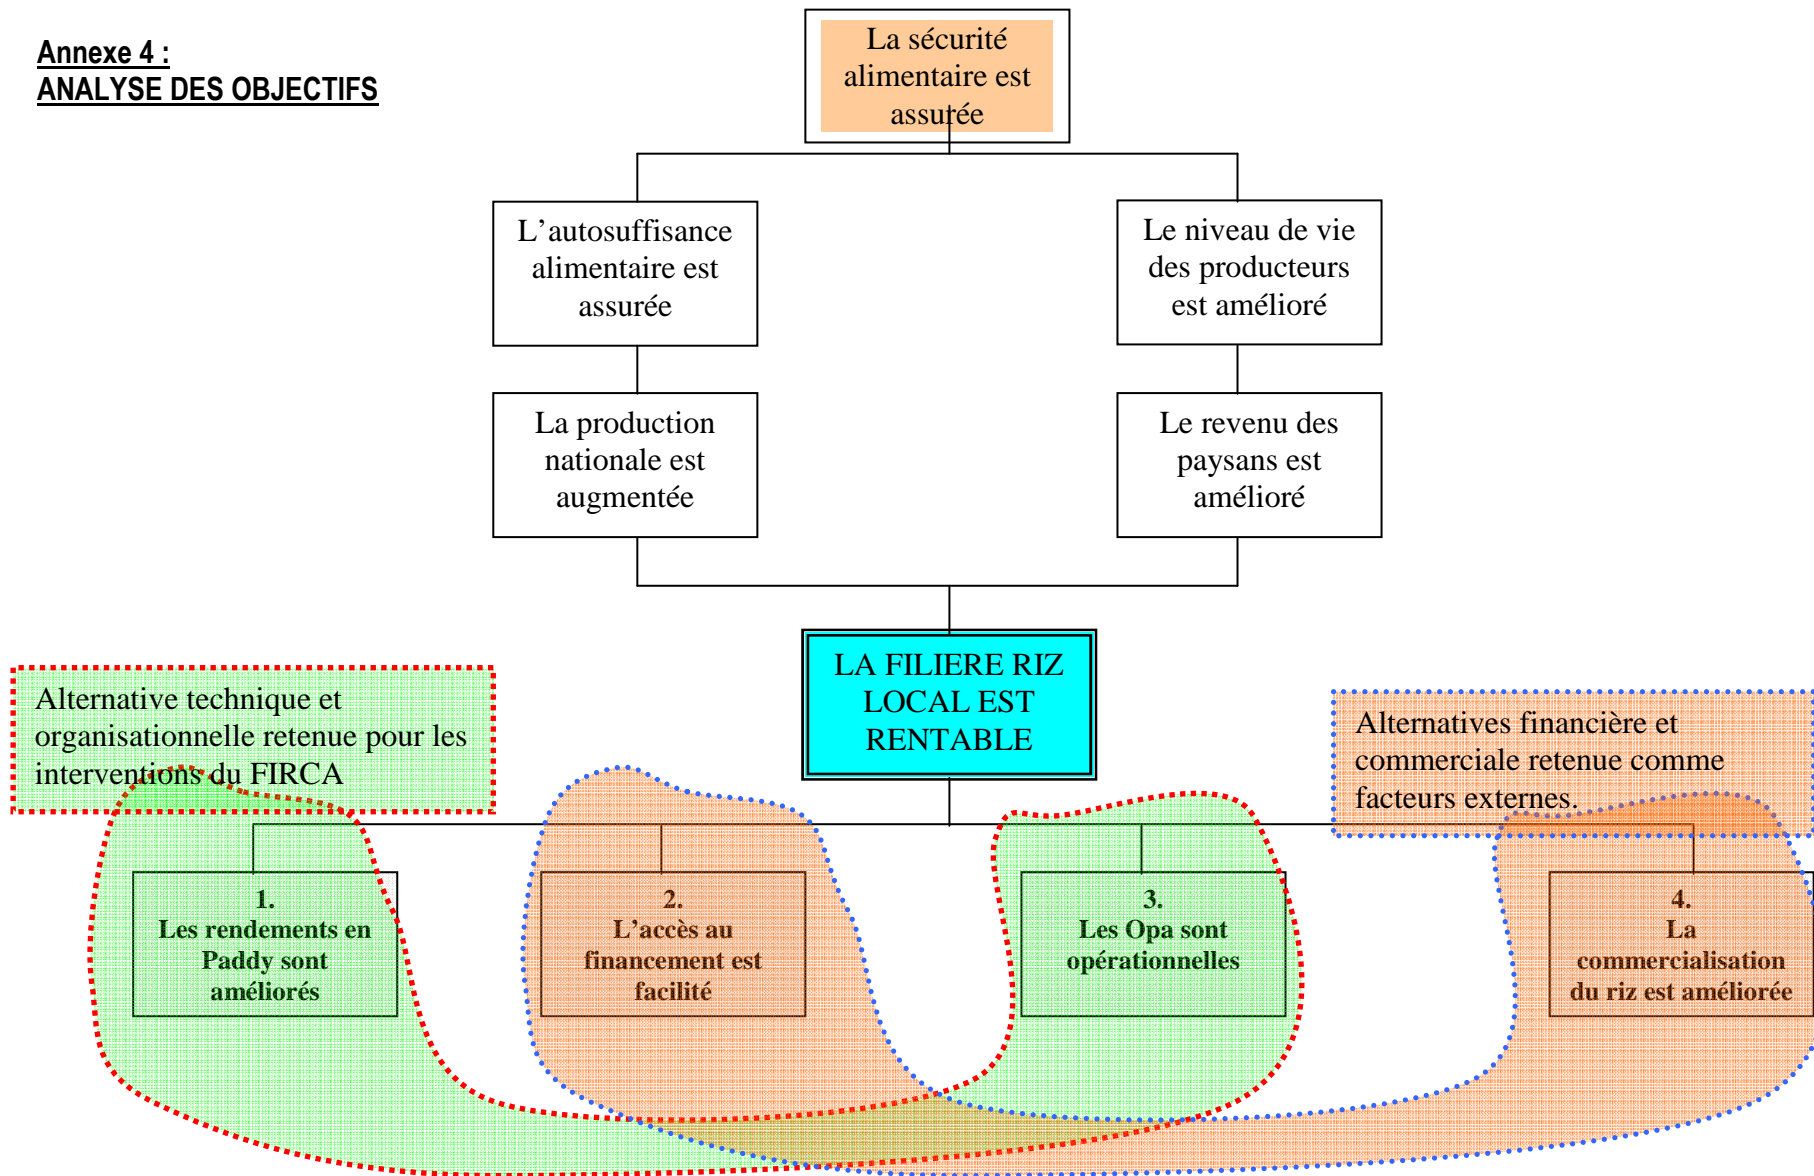


Analyse des objectifs
Sous-objectifs

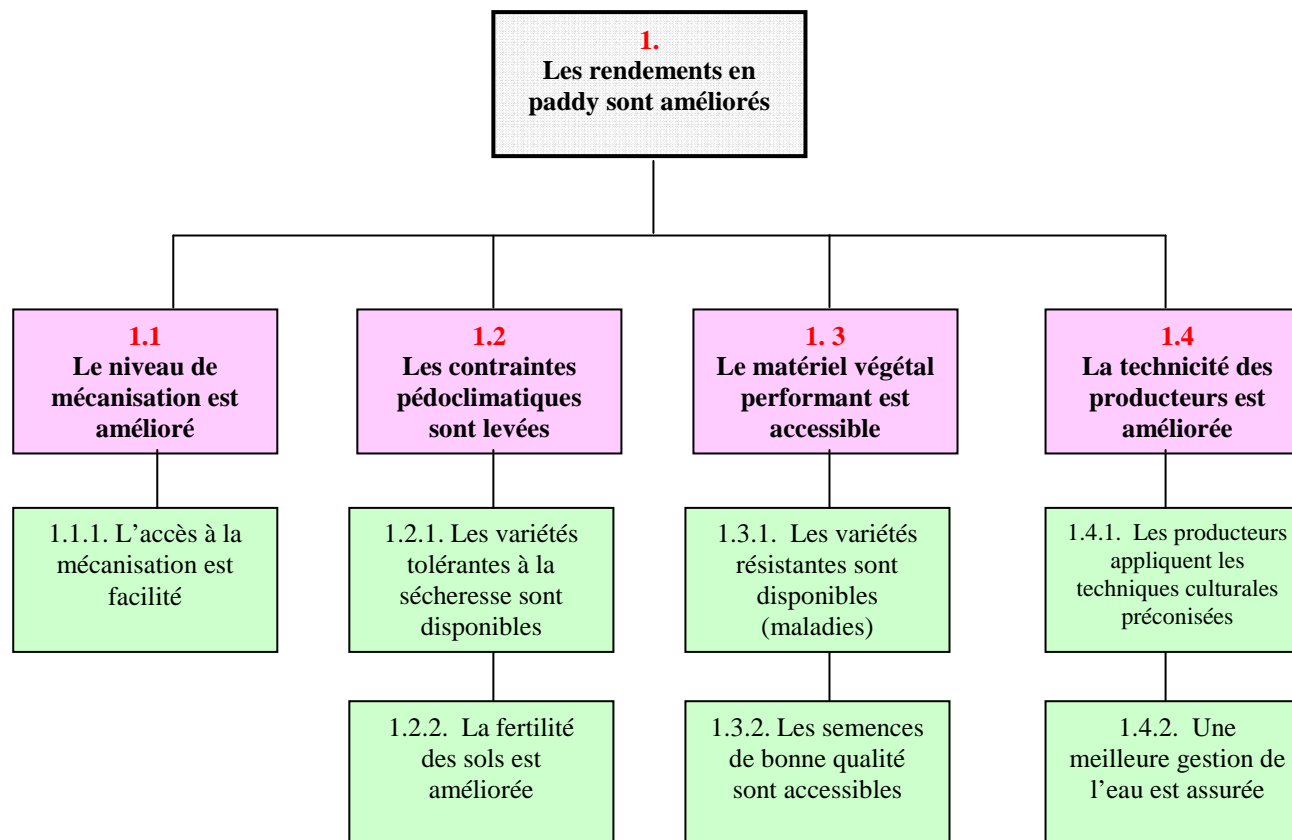

Analyse des objectifs
Sous-objectifs

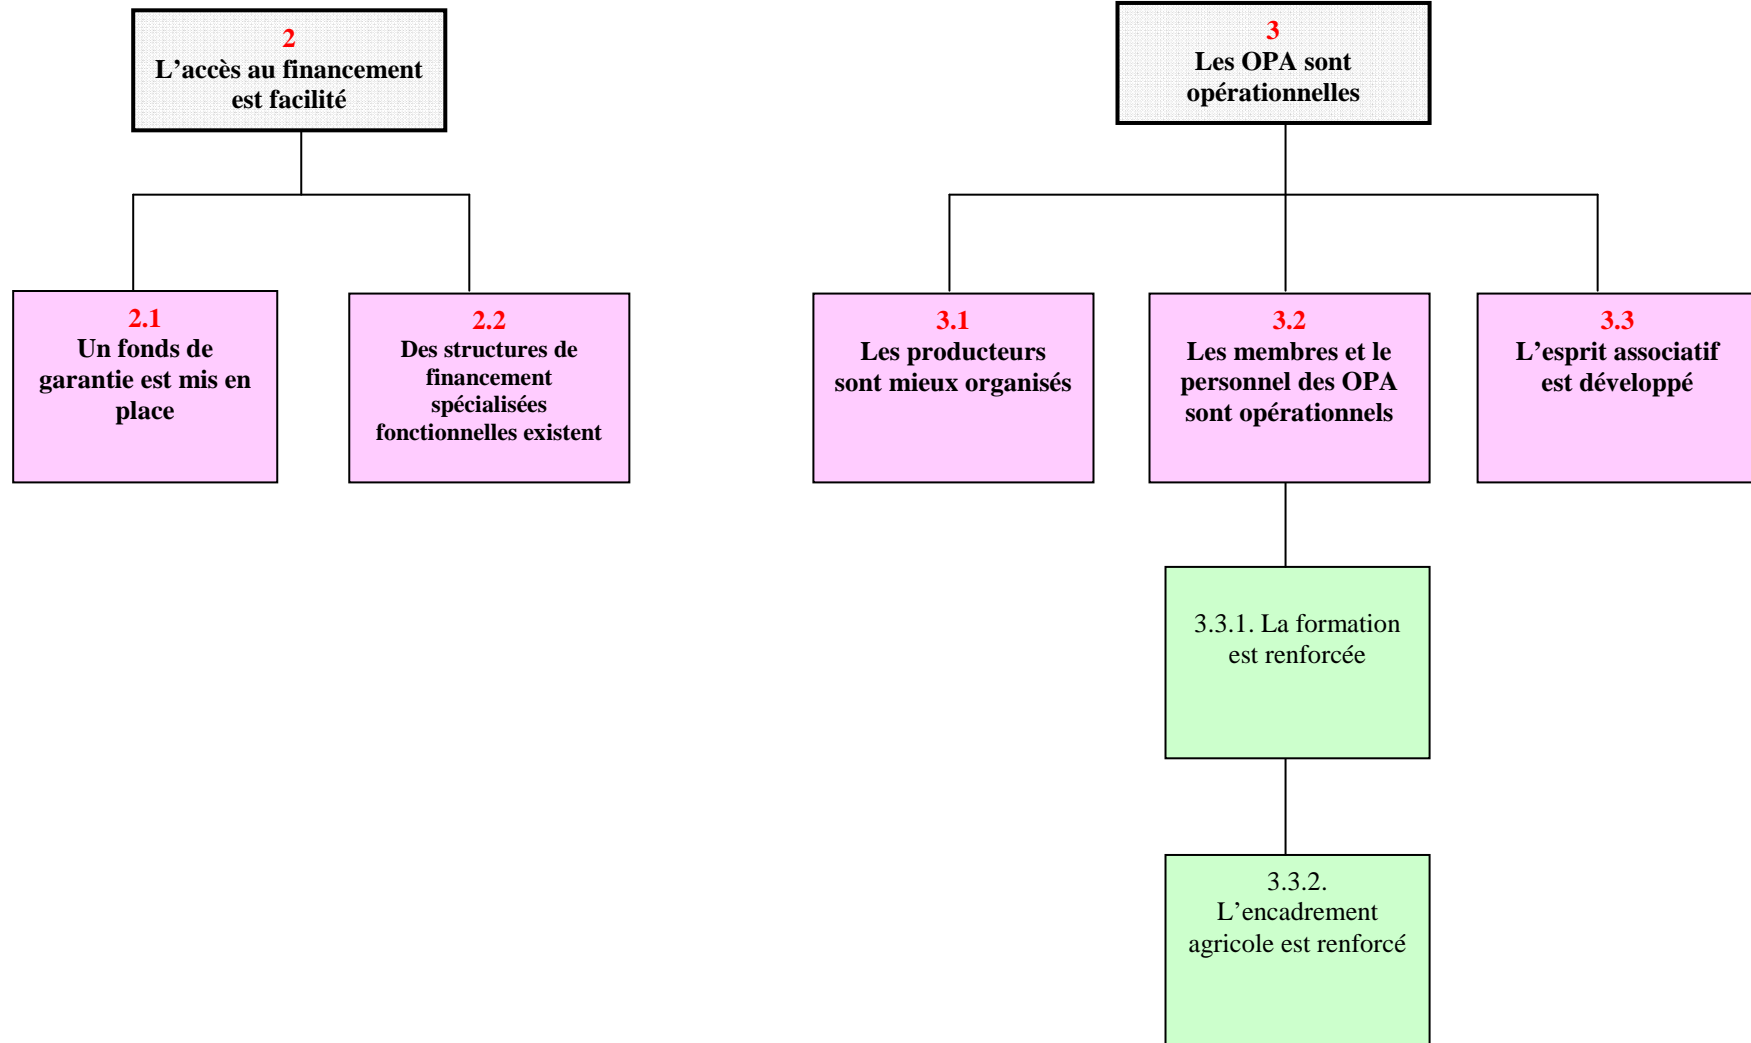

Analyse des objectifs
Sous-objectifs

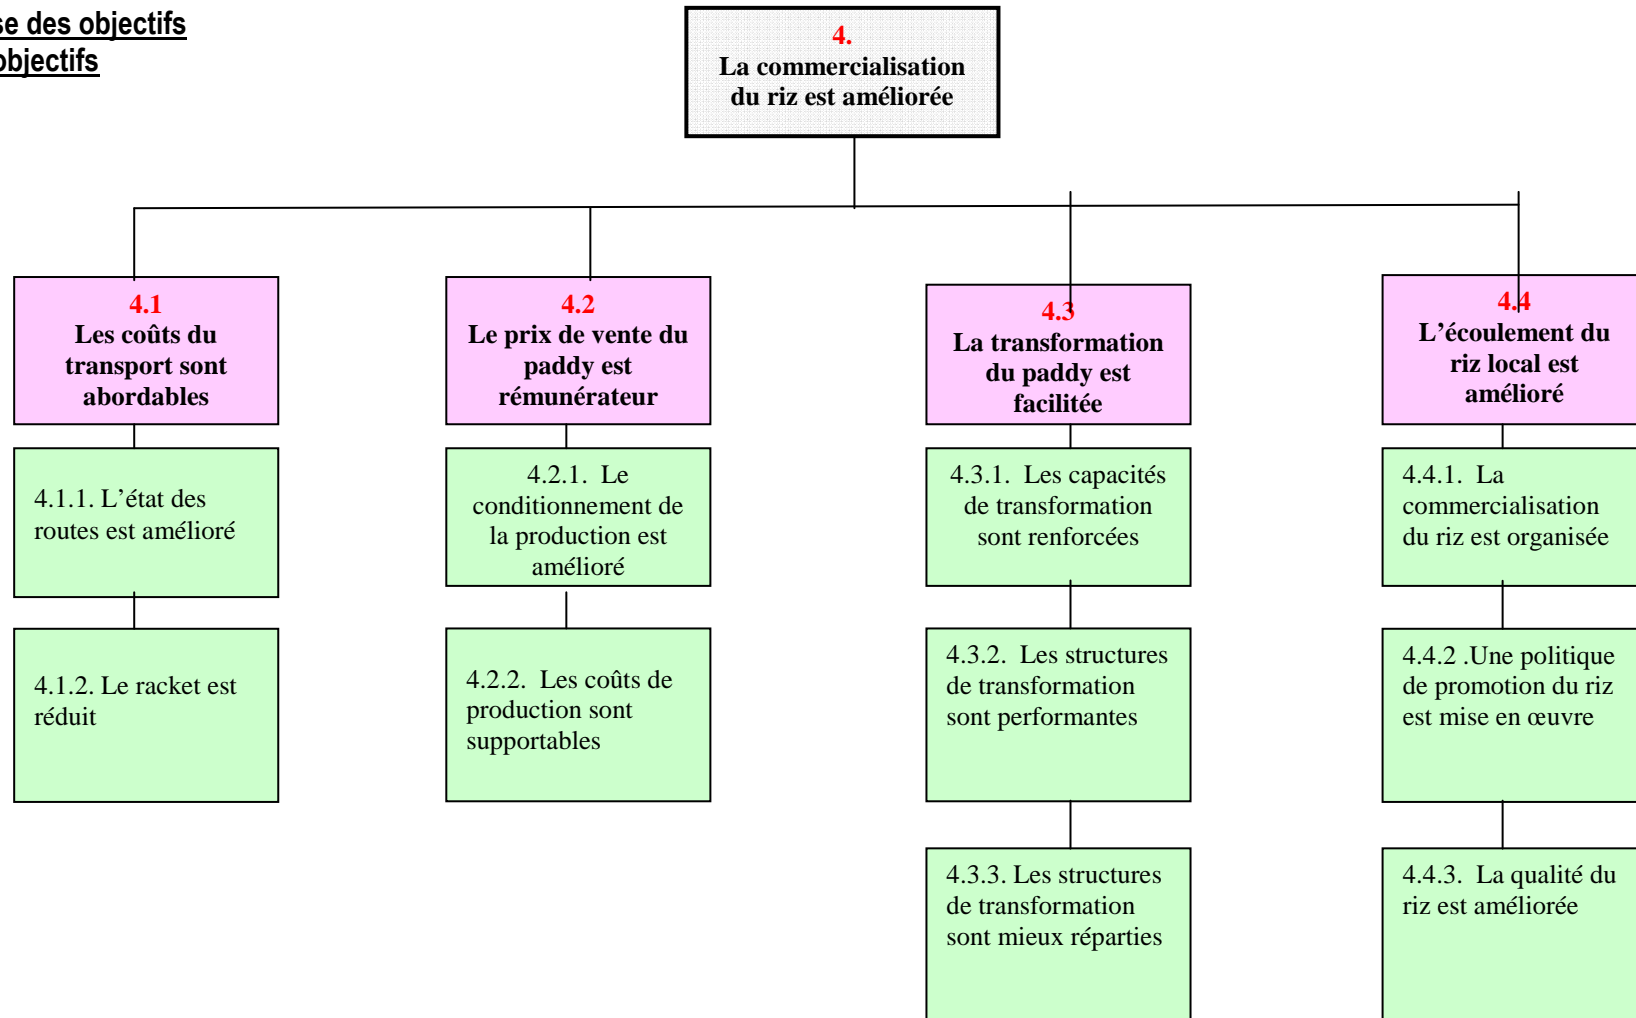

Annexe 5 :
FIRCA – RIZ, Analyse des concernés

TRANSPORTEURS	ONG	ETAT	PRODUCTEURS ET OPA RIZ
SIFCA RIZ	OVDL (Organisation des Volontaires de Développement Local)	Ministère du Commerce	ANARIZ - CI
USINIERS		Direction départementale de l'Agriculture	Coopératives rizicoles
		MINAGRI	Union de Coopératives
		PNR	COPRORIZ
			Riziculteurs

STRUCTURES D'ENCADREMENT	FOURNISSEURS D'INTRANTS	CONSOMMATEURS	CABINETS D'ETUDES
ANADER	Fournisseurs d'intrants chimiques		BFCD (Bureau de Formation et de Conseil en Développement)
	Fournisseurs de matériel agricole		

PRODUCTEURS DE SEMENCES	COMMERCANTS	INSTITUTIONS DE FINANCEMENT	INSTITUTIONS DE RECHERCHE
Semenciers Multiplicateurs de semences	Importateurs de riz	Bailleurs de fonds	ADRAO
	Acheteurs grossistes	Structures de micro - finances	CNRA
	Vendeurs détaillants		

Annexe 6

FILIERE RIZ

FICHES PROJETS ET COUT DU PROGRAMME OPERATIONNEL
2005-2006

**FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES
FILIERE RIZ LOCAL
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS**

FILIERE RIZ			
TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS			
N°	Référence	Projets	Coûts (FCFA)
Recherche			
1	Re	Sélection de variétés résistantes à la sécheresse	87 500 000
2	Re	Sélection de variétés résistantes à la pyriculariose	96 800 000
3	Re	Production de semences améliorées	419 040 000
4	Re	Etablissement d'itinéraires techniques	62 700 000
<i>Sous Total Recherche</i>			666 040 000
Conseil agricole			
5	Co	Renforcement du Conseil agricole	589 000 000
6	Co	Vulgarisation des techniques de production et de conservation	1 888 080 000
<i>Sous Total Conseil agricole</i>			2 477 080 000
Formation			
7	Fo	Formation des multiplicateurs de semences	172 303 000
<i>Sous Total Formation</i>			172 303 000
Renforcement des OPA			
8	Opa	Appui à la création des coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles	212 400 000
9	Opa	Elaboration de plans de développement pour les coopératives	151 600 000
<i>Sous Total OPA</i>			364 000 000
Etude et Appui Institutionnel			
10	Etude	Renforcement des capacités du LANADA pour la certification des semences	244 000 000
11	Etude	Etude de la structure des coûts	30 255 000
<i>Sous Total Etude et Appui Institutionnel</i>			274 255 000
TOTAL GENERAL			3 953 678 000

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°01/2005-2006
Intitulé du projet : _SELECTION DE VARIETES RESISTANTES A LA SECHERESSE	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz local</i>
2. Objectifs	○ Mettre au point des variétés de riz adaptées aux conditions hydriques limitantes
3. Description de l'état actuel	○ Des variétés sont abandonnées du fait de l'irrégularité des pluies et de la baisse de la pluviométrie
4. Contraintes	○ Ressources humaines insuffisantes
5. Population bénéficiaire	○ Les producteurs de riz
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Sources de résistance identifiées
7. Actions passées ou en cours	○ conduite des essais en station ○ Conduite des essais en milieu réel
8. Activités proposées	○ Conduire des tests de criblages en station ○ Evaluation en milieu réel
9. Durée d'exécution	○ 4 ans (2 x 2 ans)
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	
12. Partenaires	○ Structures de recherches et de développement
13. Coût prévisionnel	87 500 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ Bailleurs de fonds ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Les tests de criblage en station sont mis en place
- Les tests en milieu réel sont réalisés
- La promotion des variétés tolérantes à la sécheresse est réalisée
- Le groupe cible est formé sur les nouvelles variétés
- Une journée du paysan est organisée à la fin du projet

FILIERE RIZ				
Projet N° 0/2005-2006 : Sélection de variétés de riz résistantes à la sécheresse				
Composantes, Sous Composantes et Activités	Unités	Qtés	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I. Sélection de variétés de riz (1)				
1.1 Conduire des tests de criblage en station	Forfait	1	6 300 000	6 300 000
1.2 Evaluer des variétés prometteuses en en milieu réel	Forfait	1	10 500 000	10 500 000
1.3 Promouvoir les variétés tolérantes à la sécheresse	Forfait	1	12 200 000	12 200 000
Sous Total (I)				29 000 000
II. Formations et réunions				
2.1 Formation groupe cible	H/Mois	50	250 000	12 500 000
2.2 Journée du paysan	H/Mois	50	250 000	12 500 000
Sous Total (II)				25 000 000
III. Honoraires				
3.1 Chercheur	H/Mois	5	3 300 000	16 500 000
3.2 Autres (TSR, IR)	H/Mois	5	2 200 000	11 000 000
Sous Total (III)				27 500 000
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES I+II+III				81 500 000
IV. Gestion du projet				
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
4.2 Appui à l'exécution	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
4.3 Suivi- Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
S/total (IV)				6 000 000
TOTAL GENERAL				87 500 000

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°02/2005-2006
<u>Intitulé du projet</u> : SELECTION DE VARIETES DE RIZ RESISTANTES A LA PYRICULARIOSE	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz local</i>
2. Objectifs	○ Réduire les pertes de production de riz dues à la pyriculariose
3. Description de l'état actuel	○ 30% en moyenne de perte de la production depuis 2000 (cas très préoccupant dans certaines zones)
4. Contraintes	○ Insuffisance de ressources humaines
5. Population bénéficiaire	○ Les producteurs de riz
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Choix des sites d'essais ○ Conduite des études en milieu réel
7. Actions passées ou en cours	○ Des essais d'évaluation pour la résistance à la pyriculariose ont été conduits dans l'ouest en 2000
8. Activités proposées	○ Identifier les variétés de riz résistantes aussi bien à la pyriculariose foliaire qu'à la pyriculariose du cou ○ Conduire des essais multi-locaux
9. Durée d'exécution	2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	
12. Partenaires	○ Structures de recherches et de développement
13. Coût prévisionnel	○ 96 800 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ Bailleurs de fonds ○ Firmes semencières
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Les tests multilocaux sont mis en place
- La promotion des nouvelles variétés est réalisée
- Le groupe cible est formé
- Une journée du paysan est organisée à la fin de chaque année

FILIERE RIZ				
Projet N° 02/2005-2006 : Sélection de variétés de riz résistantes à la pyriculariose				
Composantes et sous composants et activités	Unités	Quantité	Coût/unité	Total
I. Sélection de variétés de riz tolérantes à la pyriculariose (1)				
1.1 Identification de variétés de riz tolérantes à la pyriculariose foliaire et à la pyriculariose du cou	Forfait	1	10 200 000	10 200 000
1.2 Conduite d'essais multilocaux	Forfait	1	10 400 000	10 400 000
1.3 Promotion de variétés améliorées de riz tolérantes à la pyriculariose foliaire et à la pyriculariose du cou	Forfait	1	12 200 000	12 200 000
Sous Total (I)				32 800 000
II. Formations et réunions				
2.1 Formation groupe cible	H/Mois	50	250 000	12 500 000
2.2 Journée du paysan	H/Mois	50	250 000	12 500 000
Sous Total (II)				25 000 000
III. Honoraires				
3.1 Chercheur	H/Mois	5	3 300 000	16 500 000
3.2 Autres (TSR, IR)	H/Mois	5	3 300 000	16 500 000
Sous Total (III)				33 000 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				90 800 000
IV. Gestion du projet				
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
4.2 Appui à l'exécution	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
4.3 Suivi - Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000
Sous Total IV				6 000 000
TOTAL GENERAL				96 800 000

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°03/2005-2006
Intitulé du projet : PRODUCTION DE SEMENCES AMELIOREES	
1. Orientation	Améliorer la rentabilité de la filière Riz locale
2. Objectifs	○ Mise à la disposition des producteurs de riz des semences de variétés améliorées de bonne qualité en quantité suffisante
3. Description de l'état actuel	○ Semences non disponibles ○ Faible taux de germination ○ Taux d'impureté au champ élevé
4. Contraintes	○ Mauvaise organisation de la filière semencière
5. Population bénéficiaire	○ Les producteurs de riz
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Production des semences de base en station ○ Production des semences de qualité par des semenciers sélectionnés
7. Actions passées ou en cours	OSP – CBSS
8. Activités proposées	○ Choisir les variétés améliorées ○ Multiplier les semences de base en station ○ Sélectionner les semenciers multiplicateurs dans les régions de production ○ Contrôler les semences au champ ○ Certifier les semences produites ○ Conditionner les semences produites ○ Former les multiplicateurs sélectionnés
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ CNRA ○ Autres institutions de recherche
12. Partenaires	○ Sociétés semencières ○ OPA, ○ MINAGRI ○ PNR
13. Coût prévisionnel	419 040 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA ○ PNR ○ MINAGRI
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Les 15 stations régionales sont créées, aménagées et équipées
- A la fin du projet les rendements sont de 2,5 tonnes/ha pour le riz pluvial et de 5 tonnes /ha pour le riz irrigué
- 5 250 producteurs semenciers sont installés
- Au moins 2 625 tonnes de semences sont produites

FILIERE RIZ					
Projet N° 03/2005-2006 : Production de semences améliorées					
Composantes , Sous Composantes et Activités	Unités	Quantités	CU (FCFA)	CT (FCFA)	Observations
1. CHOIX DES VARIETES AMELIOREES (1)					Cette concertation va
1.1. Identification de personnes ressources	H/J	20	230 000	4 600 000	permettre de trier les
1.2. Frais de Transport	Km	6000	312	1 872 000	variétés à retenir pour
1.3. Enquête sur les 58 départements	H/J	360	200 000	72 000 000	l'enquête.
SOUS TOTAL (1)				78 472 000	
2. MULTIPLICATION DES SEMENCES DE BASE EN STATION					
2.1. Identification des sites de stations	H/J	23	200 000	4 600 000	* il est envisagé de créer
2.2. Etudes techniques pour l'aménagement	H/J	165	60 000	9 900 000	15 stations régionales de
2.3. Aménagement des stations	forfait	1	50 000 000	50 000 000	5 ha chacune
2.4. Equipement des stations	forfait	1	40 000 000	40 000 000	
2.5 Frais de Déplacement	Km	5000	312	1 560 000	
SOUS TOTAL (2)				106 060 000	
3. SELECTION DES SEMENCIERS					
3.1. Cibler et sensibiliser les semenciers	H/J	30	50 000	1 500 000	
3.2. Formation des formateurs	H/J	6	200 000	1 200 000	350 semenciers seront
3.3. Former les semenciers	H/J	450	50 000	22 500 000	identifiés dans un rayon de
3.4. Déplacement	Km	4000	312	1 248 000	100 km autour de chaque
SOUS TOTAL (3)				26 448 000	station
4. CONTROLE DES SEMENCES AU CHAMP					
4.1. Acquisition de semence de base	Kg	4000	1 500	6 000 000	
4.2. Appui à la production	H/J	900	12 000	10 800 000	
4.3. Formation de contrôleurs semenciers	H/J	9	200 000	1 800 000	
SOUS TOTAL (4)				18 600 000	
5. CONDITIONNEMENT DES SEMENCES PRODUITES					
5.1. Appui au conditionnement	H/J	150	12 000	1 800 000	
5.2. Acquisition de matériel de conditionnement	unité	15	10 000 000	150 000 000	
5.3. Frais de Déplacement	Km	5000	312	1 560 000	
5.4. Acquisition de sacs d'emballage de semence	unité	50 000	250	12 500 000	Sacs de 5kg, 25 kg et 50 kg.
SOUS TOTAL (5)				165 860 000	
6. CERTIFICATION DES SEMENCES PRODUITES					
6.1. Appui à la certification	H/J	720	5 000	3 600 000	
SOUS TOTAL (6)				3 600 000	
TOTAL COMPOSANTES 1+2+3+4+5+6				399 040 000	
7. Gestion du projet					
7.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000	
7.2 Appui à l'exécution	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000	
7.3 Suivi- Evaluation	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000	
SOUS TOTAL (7)				20 000 000	
TOTAL GENERAL				419 040 000	

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°04/2005-2006
Intitulé du projet : ETABLISSEMENT D'ITINERAIRES TECHNIQUES	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz local</i>
2. Objectifs	○ Améliorer la productivité dans les différentes zones pédoclimatiques
3. Description de l'état actuel	○ Les itinéraires techniques actuels sont standardisés ○ Inexistante d'itinéraires techniques adaptés aux spécificités des zones
4. Contraintes	
5. Population bénéficiaire	○ Les producteurs
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Conduire des études dans les différentes zones climatiques ○ Mettre en place des essais multilocaux
7. Actions passées ou en cours	○ Mise en place d'essais dans les différentes zones pédoclimatiques ○ Action de restauration de la fertilité des sols au niveau de quelques régions
8. Activités proposées	○ Déterminer les différentes zones climatiques ○ Mettre en place des essais ○ Diffuser les résultats
9. Durée d'exécution	○ 1 ^{ère} phase 2 ans (6 ans)
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	○ A déterminer
13. Coût prévisionnel	○ 62 700 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Les tests variétaux de riz sont mis en place dans les différentes zones pédoclimatiques
- Les résultats des tests sont diffusés
- Une journée du paysan à la fin du projet
- Le groupe cible est formé sur les itinéraires régionalisés

FILIERE RIZ					
Projet N° 042005-2006 : Adaptation de variétés de riz aux zones agroécologiques					
Composantes et Sous Composants et activités	Unités	Quantité	Coût/unité	Total	Observations
I. Adaptation de variétés de riz aux zones agroécologiques					
1.1 Mise en place de tests variétaux de riz dans les différentes zones pédoclimatiques	Forfait	1	4 500 000	4 500 000	a)(Intrants, semences, plants, petits matériels agricoles,
					consommable laboratoire bureau et informatique)
1.2 Adaptation variétale des itinéraires techniques	Forfait	1	9 500 000	9 500 000	b) transport (535 Km), frais de mission (35 000/j)
1.3 Diffusion des résultats	Forfait	1	12 200 000	12 200 000	c) Mo occasionnelle, analyses, documentation, communication
Sous Total (I)				26 200 000	
II. Formations et réunions					
2.1 Formation groupe cible	H/Mois	50	250 000	12 500 000	
2.2 Journée du paysan	H/Mois	50	250 000	12 500 000	
Sous Total (II)				25 000 000	
III. Honoraires					
3.1 Chercheur	H/Mois	1	3 300 000	3 300 000	150 000/jour, 22 jours mois
3.2 Autres (TSR, IR)	H/Mois	1	2 200 000	2 200 000	100 000/jour, 22 jours mois
Sous Total (III)				5 500 000	
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				56 700 000	
IV. Gestion du projet					
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000	
4.2 Appui à l'exécution	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000	
4.3 Suivi- Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000	
Sous Total (IV)				6 000 000	
TOTAL GENERAL				62 700 000	

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°05/2005-2006
Intitulé du projet : RENFORCEMENT DU CONSEIL AGRICOLE	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz local</i>
2. Objectifs	○ Renforcer les capacités des OPS et des producteurs
3. Description de l'état actuel	○ L'appui extérieur n'est pas satisfaisant (ANADER, ONG, etc.) ○ L'appui interne est peu développé mais efficace (OPA, etc.)
4. Contraintes	○ Adhésion des producteurs et des OPA
5. Population bénéficiaire	○ OPA et producteurs de riz
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Coordination des actions d'appui interne et externe sur le terrain
7. Actions passées ou en cours	○ Encadrement technique SODERIZ, SODEFEL, SATMACI, CIDT, CIDV etc, ex-SATMACI etc. ○ PNR, ANADER, ONG....
8. Activités proposées	○ Identifier les besoins ○ Elaborer un programme ○ Planifier les actions ○ Exécuter ○ Evaluer
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	○ A déterminer
13. Coût prévisionnel	589 000 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 2 Centres régionaux de formation aux métiers du riz sont créés et sont opérationnels au plus tard à la fin de la première année du projet
- 10 Centres pilotes d'appui à la gestion sont créés au plus tard au deuxième semestre du projet

FILIERE RIZ				
Projet N° 052005-2006 : Renforcement du Conseil agricole				
Composantes et sous composants et activités	Unités	Quantités	CU (FCFA)	CT(FCFA)
I. RENFORCEMENT DES CAPACITES				
1.1 Centres régionaux de formation aux métiers du riz				
1.1.1 Création et équipement de centres Régionaux de formation des riziculteurs (CRFR)	Nombre	2	150 000 000	300 000 000
1.1.2 Fonctionnement des Centres de formation	Nombre	2	50 000 000	100 000 000
1.2 Formation des OPA et des Riziculteurs				
	H/Mois	10	5 000 000	50 000 000
Sous Total (I)				450 000 000
II. APPUI A LA GESTION DES CODERIZ ET AUTRES COOPERATIVES				
2.1 Mise en place des centres Pilotes d'Appui à la gestion	Nombre	10	10 700 000	107 000 000
Sous Total (II)				107 000 000
TOTAL COMPOSANTES I + II				557 000 000
III. GESTION DU PROJET				
3.1 Etude de faisabilité	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000
3.2 Suivi - Evaluation	H/Mois	3	4 000 000	12 000 000
3.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	3	4 000 000	12 000 000
Sous Total (III)				32 000 000
TOTAL GENERAL				589 000 000

Observations

Chaque Centre régional de formation aux métiers du riz sera équipé de :

1 motoculteur, 1 faucheuse, 1 sécheuse, 1 vanneuse, 1 trieuse, calibreuse, 1 mini-décortiqueuse

FIRCA Programme Riz	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet : N° 06/2005-2006
Intitulé du projet : Vulgarisation des techniques de production et de conservation	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Augmenter la production ○ Améliorer le rendement et les conditions de travail
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faible rendement ○ Méthodes de travail rudimentaires
4. Contraintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dispersions des exploitations de petite taille. ○ Coût élevé et inadaptation du matériel d'exploitation ○ Réticence des acteurs aux changements
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Producteurs du riz ○ Coopératives
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de sensibilisation et de formation. ○ Mise en place des parcelles de démonstrations ○ Champs- écoles
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Actions de l' ANADER ○ Actions de SODEFEL ○ Actions de divers ONG
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser et former les producteurs ○ Mettre à disposition les outils et méthodes ○ Créer un cadre de rencontre entre les chercheurs et les producteurs.
9. Durée d'exécution	○ 2ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ CNRA ○ ONG
13. Coût prévisionnel	1 888 080 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

FILIERE RIZ				
Projet N° 062005-2006 : Vulgarisation des techniques de production et de conservation				
Composantes et sous composants et activités	Unités	Quantités	CU (FCFA)	CT(FCFA)
I. VULGARISATION AGRICOLE				
1.1 Mise en place d'un système de maîtrise des opérations post récolte	H/Mois	10	4 000 000	40 000 000
1.2 Transfert de technologies	CEP	2 100	864 800	1 816 080 000
Sous Total (I)				1 856 080 000
II. GESTION DU PROJET				
2.1 Etude de faisabilité	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000
2.2 Suivi - Evaluation	H/Mois	3	4 000 000	12 000 000
2.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	3	4 000 000	12 000 000
Sous Total (III)				32 000 000
TOTAL GENERAL				1 888 080 000

Observations
1) Les Champs-Ecoles Paysans (CEP) serviront de lieux :
(i) de rencontre entre les producteurs, les vulgarisateurs et les chercheurs
(ii) de formation des vulgarisateurs ou des paysans relais qui formeront à leur tour d'autres producteurs
2) Le coût de chaque CEP comprend les frais de formation du TS et de l'Agent de base (salaires, équipement, fonctionnement) le matériel de travail ainsi que les intrants de démonstration (semences, engrais et pesticides)

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°07/2005-2006
<u>Intitulé du projet</u> : FORMATION DES MULTIPLICATEURS DE SEMENCES	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz locale</i>
2. Objectifs	○ Garantir la disponibilité du matériel végétal performant
3. Description de l'état actuel	○ Insuffisance de multiplicateurs professionnels
4. Contraintes	○ Garantir l'enlèvement de la production
5. Population bénéficiaire	- Les producteurs élites
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Former les multiplicateurs régionaux
7. Actions passées ou en cours	○ Action de formation du PNR, CBSS, ANADER (FMACI)
8. Activités proposées	○ Identifier les producteurs multiplicateurs ○ Etablir le programme ○ Exécuter ○ Evaluer
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	○ A déterminer
13. Coût prévisionnel	172 303 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 10 TS sont formés, à raison d'un par région administrative
- 100 Agents de base sont formés
- 200 producteurs semenciers sont formés

FILIERE RIZ				
Projet N° 07/2005-2006 : Formation des multiplicateurs de semences				
Composantes et Activités	Unités	Qtés	CU (FCFA)	CT (FCFA)
I. CREATION DE CENTRES PILOTES DE PRODUCTION DE SEMENCES				
I.1 Aménagement de 7 centres pilotes de production de semences	Nombre	7	1 000 000	7 000 000
I.2 Construction de hangars de séchage, de conditionnement et de magasins de stockage	Nombre	7	10 000 000	70 000 000
I.3 Equipement en balances, balances et humidimètres	forfait	1	7 000 000	7 000 000
Sous TOTAL (I)				84 000 000
II. FORMATION				
2.1 Identification et sensibilisation des bénéficiaires	H/J	90	120 000	10 800 000
2.2 Atelier de restitution (location salle, matériel et pause café)	jour	1	1 000 000	1 000 000
2.3 Formation des formateurs (1)				
2.3.1 Elaboration des modules et du programme de formation	H/J	15	100 000	1 500 000
2.3.2 Honoraires d'expert pour l'exécution de la formation des TS	H/J	10	100 000	1 000 000
2.3.3 Restauration, Hébergement des TS	H/J	19	20 000	380 000
2.3.3 Fournitures de bureaux pour la formation des TS	forfait	1	250 000	250 000
2.3.4 Déplacement des Stagiaires	Nombre	19	15 000	285 000
2.4 Formation des ADR (en formation de quinzaine) (2)	Nombre	500	5 000	2 500 000
2.5 Formation des bénéficiaires (3)				
2.5.1 Formation-Visite de l'ADR (agent formateur principal) (4)	H/J	1 800	10 000	18 000 000
2.5.2 Formation-Visite du TS	H/J	600	35 000	21 000 000
Sous TOTAL (II)				56 715 000
III. COORDINATION DU PROJET				
3.1 Gestion technique et administrative	H/mois	24	200 000	4 800 000
3.2 Gestion financière	H/mois	24	100 000	2 400 000
3.3 Secrétaire	H/mois	24	50 000	1 200 000
3.4 Déplacement	km	24 000	312	7 488 000
3.5 Perdiems	H/mois	24	50 000	1 200 000
3.6 Fournitures de bureau et informatiques	forfait	1	4 500 000	4 500 000
Sous TOTAL (III)				21 588 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				162 303 000
IV. GESTION DU PROJET				
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	0,5	4 000 000	2 000 000
4.2 Suivi - Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
4.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
SOUS Total (IV)				10 000 000
TOTAL GENERAL				172 303 000
Observations				
1 TS cultures annuelles à former par région administrative (1)				
1 jour de formation (pour 100 ADR) pour chacun des stades (semis, épuration, récolte, extraction des graines et conditionnement) (2)				
200 producteurs de semences sont formés de manière pratique sur le terrain. 1/2 journée par semaine et par producteur pendant 4 mois et 2 visites par mois pendant les 2 premiers mois du stockage (3)				
Le TS fait une visite de supervision (1/2 journée) par mois à chaque producteur pendant 6 mois soit 3 journées par producteur				

FIRCA Programme Riz	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet : N° 08/2005-2006
Intitulé du projet : Appui à la création des coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles	
1. Orientation	Améliorer les revenus des producteurs
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mieux gérer les coopératives et les groupements ○ Rendre les acteurs plus professionnels.
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mauvaises organisations des coopératives ○ Faible esprit coopératif ○ Membres peu formés
4. Contraintes	○ Néant
5. Population bénéficiaire	○ Les acteurs de la filière
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser les acteurs ○ Mobiliser les acteurs ○ Formation des acteurs ○ Appui à l'élaboration des procédures gestion pour les coopératives
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les formations ○ Les voyages d'échange
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Former les acteurs ○ Mettre en place des procédures de gestion normalisées et fiables au sein des coopératives ○ Créer les coopératives, les réseaux, les fédérations, les interprofessions
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les structures de formations ○ Les structures d'appuis aux OPA ○ Les ONG
13. Coût prévisionnel	212 400 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Un séminaire de concertation de 150 coopérateurs est organisé au premier semestre du projet
- 150 dirigeants de coopératives sont formés sur les modules suivants :
 - Rôle et responsabilités des dirigeants,
 - Procédures de gestion, Gestion commerciale,
 - Communication et
 - Procédures et techniques de création de structures de micro-finances
- 1000 coopérateurs sont formés sur le module « Droits et obligations du coopérateur »
- Les dirigeants et gestionnaires de 23 coopératives sont formés à la Planification et la budgétisation des activités par la méthode ZOPP

FILIERE RIZ					
Projet N° 082005-2006 : Appui à l'organisation des coopératives et au renforcement des capacités organisationnelles					
Composantes et sous composantes et activités	Unités	Quantité	CU (FCFA)	CT (FCFA)	Observations (Indicateurs de réalisation)
I- ETAT DES LIEUX , ANIMATION ET SENSIBILISATION					
1.1 Concertation avec les OPA et évaluation des besoins de formation	H/J	100	150 000	15 000 000	50 OPA à visiter par des Consultants
1.2 Organisation d'un séminaire de relance des activités des OPA	H/J	30	150 000	4 500 000	Préparation et animation du séminaire par des Consultants
1.3 Participation des dirigeants des OPA au séminaire	H/J	450	5 000	2 250 000	150 participants (Pdt, Secrétaire, Trésorier) en 7 j
Sous Total (I)				21 750 000	
II- FORMATION DES COOPERATEURS ET DU PERSONNEL					
2.1 MODULE 1 : Rôle et responsabilités des dirigeants	H/J	1050	5 000	5 250 000	150 dirigeants pour une durée de 7 jours
2.2 MODULE 2 : Droits et obligations du coopérateur	H/J	7000	3 000	21 000 000	1000 coopérateurs pour une durée de 7 jours
2.2 MODULE 3 : Planification et budgétisation des activités	H/J	750	50 000	37 500 000	Honoraires + Déplacement + Subsistance des Consultants pour la formation des membres des 23 OPA par la méthode ZOPP
2.3 MODULE 4 : Procédures de gestion	H/J	1050	5 000	5 250 000	150 dirigeants pour une durée de 7 jours
2.4 MODULE 5 : Gestion commerciale	H/J	1050	5 000	5 250 000	150 dirigeants pour une durée de 7 jours
2.5 MODULE 6 : Gestion financière et comptable	H/J	700	5 000	3 500 000	100 Gérants et comptables pour une durée 7j
2.6 MODULE 7 : Communication	H/J	1050	5 000	5 250 000	150 dirigeants pour une durée de 7 jours
2.7 MODULE 8 : Procédures et techniques de création de structures de micro-finances	H/J	1050	5 000	5 250 000	150 dirigeants pour une durée de 7 jours
2.8 Frais de formation	H/Mois	24	3 600 000	86 400 000	Honoraires + Subsistance+Déplacement des Formateurs
Sous Total (II)				174 650 000	
TOTAL COMPOSANTES TECHNIQUES (I+II)				196 400 000	
III. GESTION DU PROJET					
3.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000	
3.2 Suivi- Evaluation	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000	
3.3. Appui à l'exécution du Projet	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000	
Sous Total (III)				16 000 000	
TOTAL GENERAL				212 400 000	

FIRCA Programme Riz	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet : 09/2005-2006
Intitulé du projet : Elaboration des plans de développement	
1. Orientation	<i>Améliorer les revenus des producteurs</i>
2. Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ Avoir une meilleure visibilité sur l'avenir ○ Avoir un tableau de bord
3. Description de l'état actuel	<ul style="list-style-type: none"> ○ Peu de plans de développement dans la filière
4. Contraintes	-
5. Population bénéficiaire	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les acteurs de la filière du vivrier
6. Stratégie de Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sensibiliser et former à la planification.
7. Actions passées ou en cours	<ul style="list-style-type: none"> ○ Quelques coopératives ont un plan de développement.
8. Activités proposées	<ul style="list-style-type: none"> ○ Faire le diagnostic de chaque coopérative. ○ Elaborer le plan
9. Durée d'exécution	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	<ul style="list-style-type: none"> ○ A identifier
12. Partenaires	<ul style="list-style-type: none"> ○ ANADER ○ ONG ○ INADES
13. Coût prévisionnel	151 600 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- Au moins 30 coopératives disposent d'un plan de développement
- Au moins 20 coopératives ont mis en œuvre leur plan de développement

FILIERE RIZ					
Projet N° 08/2005-2006 : Elaboration d'un plan de développement pour les coopératives					
Composantes, Sous Composantes et activités	Unités	Qtés	CU (FCFA)	CT (FCFA)	Observations
I. Elaboration du plan					Coût du projet pour 30 Coopératives
1.1 Missions et réunions préparatoires	H/jours	120	200 000	24 000 000	4 jours par coopératives
1.2 Atelier de planification participatif	H/jours	300	200 000	60 000 000	10 jours par coopératives
1.3 Edition des plans	Nombre	30	200 000	6 000 000	
1.4 Coût d'organisation des ateliers	Nombre	30	120 000	3 600 000	Prise en charge de 25 personnes par coopérative
Sous Total (I)				93 600 000	
II. Appui à la mise en œuvre des plans					
2.1 Honoraires d'experts- consultants	H/jours	180	200 000	36 000 000	3 jours par coopérative et par an
2.2 Frais de mission	jours	240	50 000	12 000 000	Frais de séjour + carburant véhicule
Sous Total (II)				48 000 000	
TOTAL COMPOSANTES I + II				141 600 000	
III. GESTION DU PROJET					
3.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	2 000 000	
3.2 Suivi - Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000	
3.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000	
Sous Total (III)				10 000 000	
TOTAL GENERAL				151 600 000	

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N° 10/2005-2006
Intitulé du projet : RENFORCEMENT DES CAPACITES DU LANADA POUR LACERTIFICATION DES SEMENCES	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière Riz local</i>
2. Objectifs	○ Améliorer la qualité des semences par la certification
3. Description de l'état actuel	○ Faible taux de germination ○ Taux d'impureté au champ élevé
4. Contraintes	○ Mauvaise organisation de la filière
5. Population bénéficiaire	○ LANADA, Producteurs de Riz
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Etat des lieux du Laboratoire en matière de certification des semences ○ Identification des besoins ○ Renforcement des capacités
7. Actions passées ou en cours	○ OSP
8. Activités proposées	○ Inventorier l'équipement, les ressources humaines et les besoins de formation ○ Acquérir les équipements nécessaires ○ Former les agents
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	○ A déterminer
13. Coût prévisionnel	244 000 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- 4 techniciens sont recyclés
- Un agronome est recruté et formé en phytopathologie
- Le laboratoire est équipé en matériel manquant et en réactifs
- Les multiplicateurs de semences sont régulièrement suivis

FILIERE RIZ				
Projet N° 102005-2006 : Renforcement des capacités du LANADA pour la certification des semences				
Composantes ou Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCFA)
I- Composante technique				
1.1 Recyclage des techniciens (a)	formation	4	10 000 000	40 000 000
1.2 Recrutement et formation d'un Agronome spécialisé en phytopathologie (b)	formation	1	34 000 000	34 000 000
1.3 Equipement du labo en matériel manquant et réactifs	lot	1	120 000 000	120 000 000
1.4 Suivi des fermes semencières et exploitants multiplicateurs ©	visites	2	15 000 000	30 000 000
Sous Total (I)				224 000 000
II- Composantes gestion du projet				
2.1 Etude de faisabilité	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000
2.2 Suivi- Evaluation	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
2.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous Total (II)				20 000 000
TOTAL GENERAL				244 000 000

Observations

(a) frais de formation, perdiem, voyage etc.
(b) frais de formation et salaire (1 000 000 F/m)
Achat gros équipements, verrerie, réactifs...
© missions, perdiem, déplacements par an..

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLES	
Programme Riz 2005-2010	
Code action : RIZ 2005-2006	Projet N°11/2005-2006
<u>Intitulé du projet</u> : ETUDE DE LA STRUCTURE DES COÛTS DE PRODUCTION DU RIZ LOCAL	
1. Orientation	<i>Améliorer la rentabilité de la filière riz local</i>
2. Objectifs	○ Permettre aux producteurs de maîtriser les coûts de production
3. Description de l'état actuel	○ Quelques tentatives du CNRA
4. Contraintes	
5. Population bénéficiaire	○ Les producteurs des OPA
6. Stratégie de Mise en œuvre	○ Etude sur la structure des coûts dans la région de Daloa
7. Actions passées ou en cours	○ Mise en place d'une équipe pluridisciplinaire pour l'exécution de l'étude
8. Activités proposées	○ Recherches documentaires ○ Collecte de données ○ Traitement et analyse des données ○ Rédaction de rapports
9. Durée d'exécution	○ 2 ans
10. Maître d'ouvrage	○ FIRCA
11. Maître d'œuvre	○ A déterminer
12. Partenaires	○ A déterminer
13. Coût prévisionnel	30 255 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	
15. Source de Financement	○ FIRCA
16. Charges récurrentes	

Indicateurs de réalisation :

- L'étude sur la structure des coûts de production du riz local est réalisée à la fin du projet

FILIERE RIZ				
Projet N° 08/2005-2006 : Etude de la structure des coûts de production du riz local				
Composantes et sous composants et activités	Unités	Quantité	CU(FCFA)	CT(FCFA)I
I. Honoraires d'experts				
1.1 Ingénieur Agro-Economiste chef de projet	H/Mois	3	4 000 000	12 000 000
1.2 Ingénieur Agronome	H/Mois	2	4 000 000	8 000 000
Sous Total (I)				20 000 000
II. Fonctionnement				
2.1 Frais de mission des experts	J	40	25 000	1 000 000
2.2 Frais kilométrique (location véhicules)	Km	6 000	210	1 260 000
2.3 Frais de carburant	L	900	550	495 000
Sous Total (II)				2 755 000
III. Divers				
3.1 Fourniture de bureau	Nombre	1	2 000 000	2 000 000
3.2 Reprographie et reliure	Nombre	1	2 500 000	2 500 000
Sous Total (III)				4 500 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				27 255 000
IV. Gestion du projet				
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	0,25	4 000 000	1 000 000
4.2 Appui à l'exécution	H/Mois	0,25	4 000 000	1 000 000
4.3 Suivi- Evaluation	H/Mois	0,25	4 000 000	1 000 000
Sous Total (IV)				3 000 000
TOTAL GENERAL				30 255 000

Annexe 7 :
FIRCA RIZ - Participants

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURE FONCTION	ADRESSE TELEPHONE E-MAIL
1	ESSE KOUADIO Jean	MINAGRI/DPAD Sous Directeur des Semences et Intrants	15 BP 1060 Abidjan 15 Cel. : 05 85 31 51 E-mail: esekdio@yahoo.fr
2	AKA née KADIO AMENAN	Programme National Riz Conseiller Technique	Tél. : 20 22 80 00 Pste 105 05 08 62 18
3	Mamadou CHERIF	ANADER Chef de Division	20 21 92 58 c.mamadou@anader.or.ci
4	OUATTARA AWA (Mme)	Association Nationale pour la Valorisation du Vivrier en Côte d'Ivoire	06 BP 263 Abidjan 06 07 99 87 31
5	ALPHONSE BOUET	CNRA Chef Programme Riz/Intérim	Tél. : 32 77 17 00 07 42 64 85 alphonse.bouet@cnra.ci
6	KESSE Hervé	MINAGRI/DPPD Chargé d'études	20 21 08 33 Poste 499 05 96 41 92 kpaulherve@conomail.com
7	SOUMAHORO Daouda Abdou	COPRORIZ Tiébissou et Yakro, Comptable	30 62 31 21 / 07 68 27 80 siskomsa@yahoo.fr
8	AMEHOUM (Mme) KONAN INES	CORERIZ Katiola Agronome-Gérante	31 66 90 72 amehines@yahoo.fr
9	SILUE KALEMOUROU	Korhogo Président	05 60 86 66 05 71 44 14
10	Tiagniplé TUO (Mme)	Union WOWEGNON Trésorerie	
11	LORNG Jean-Paul	Cabinet BERGAIN Consultant-Modérateur	05 64 62 54/07 31 11 88 jpaul-lorng@yahoo.fr
12	COULIBALY Abdoulaye	Cabinet BERGAIN Assistant modérateur	22 41 13 11
13	Laurent AMANI GOLLY	ANARIZ-CI, Conseiller en Communication	01 BP 2546 Abidjan 01 05 87 94 73 / 07 88 51 61
14	KOUAME Christophe	CNRA Coordonnateur Scientifique	08 BP 33 Abidjan 08 22 44 28 58 abj.cnra@aviso.ci
15	BEHINGBIN BIEKOU Aya	Coopérative Grenier Rizicole TIASSALE	07 88 70 89 grenier-rizicole@africk.com
16	KOUTOU ASSEMIAN Apollinaire	Coopérative Le Grenier Rizicole TIASSALE	07 88 70 89 grenier-rizicole@africk.com
17	BOUABRE Née GUEDE Jeannette		BP 2013 Daloa 05 76 84 05

**Annexe 8 :
FIRCA RIZ Programme de l'atelier**

Horaire	Activités	Travaux en :
Mardi 25/08/04		
8h 00 – 10h 00	- Ouverture : Allocution introductive - Présentation des participants - Présentation de la méthodologie - Analyse des concernés	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Analyse des problèmes : o Introduction o Brainstorming, classification o Identification Problème central o Identification des effets	Plénière
	- Identification des causes directes	Plénière
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des sous - causes (niveau 1	Plénière
	- Analyse des problèmes : Restitution	Plénière
	- Analyse des objectifs : exposé	Plénière
	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes	Plénière
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes (suite)	Plénière
	- Analyse des objectifs : Restitution	Plénière
Mercredi 26/08/04		
	- Choix des alternatives de programme/projets	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Elaboration du cadre logique : o Objectif global, Objectifs spécifiques, Résultats.	Plénière
	o Identification des activités principales	Plénière
	o Identification des Indicateurs Objectivement Vérifiables, Sources de Vérification et Hypothèses importantes.	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Identification des activités : (groupes suite)	Plénière
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des activités Restitution	Plénière
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Identification des indicateurs	Groupes

Jeudi 27/08/04

	- Choix des projets prioritaires pour les deux prochaines années	Plénière
	- Identification des indicateurs : Restitution	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets (introduction)	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café - cacao	
10h 30 – 12h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
16h 00 – 16h 30	Pause café - cacao	
16h 30 – 18h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
18h 00	- Allocution de clôture	Plénière
