

**ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES DE LA
FILIERE DES RUMINANTS**

Hôtel IBIS-Plateau: 10-12 août 2004



RAPPORT

NOVEMBRE 2004

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de sa mission, le FIRCA a initié une série d'ateliers de planification des activités des différentes filières agricoles, au sens large, dans le but de définir un Programme d'Action pour les deux (2) années à venir. C'est dans ce contexte qu'un atelier s'est tenu du 10 au 12 Août 2004, à l'Hôtel IBIS- Plateau pour la planification des activités de la filière des Ruminants¹. Il a regroupé les représentants des principaux acteurs de ladite filière ainsi que des responsables de l'administration.

Cet atelier a permis d'identifier les principales contraintes liées au développement de la production nationale des produits carnés et laitiers. Pendant trois (3) jours, les éleveurs et leurs organisations, les responsables de la santé animale, les chercheurs et les vulgarisateurs ont successivement identifié les problèmes majeurs de l'élevage en Côte d'Ivoire, défini les objectifs à atteindre ainsi que les stratégies pour les réaliser et élaboré un projet de programme opérationnel pour le FIRCA au titre des années 2005 et 2006.

Le présent document constitue le rapport de cet atelier.

2. METHODOLOGIE DE TRAVAIL

La méthodologie utilisée est la méthode de Planification Par Objectifs (PPO), adaptée au contexte particulier des objectifs recherchés par le FIRCA. C'est une méthode participative basée sur les principes de la causalité et du travail en groupes pluridisciplinaires, faisant intervenir dans la réflexion, les personnes ressources directement ou indirectement concernées par le projet.

Ainsi, les participants à l'atelier ont réalisé les différentes étapes suivantes :

- Identification des concernés;
- Analyse des problèmes;
- Analyse des objectifs ;
- Elaboration du Cadre Logique qui définit :
 - Les Objectifs Globaux ;
 - L'Objectif de la filière ;
 - Les Résultats attendus ;
 - Les Activités à mener pour atteindre chaque Résultat ;
 - Les Indicateurs Objectivement Vérifiables ;
 - Les Sources de Vérification des Indicateurs ;
 - Les facteurs externes importants pour le développement de la filière.

Ces étapes ont permis de sélectionner des actions–projets puis des projets pour les deux (2) années qui ont été résumés sous forme d'ébauche de fiches–projets.

¹ Pour cet atelier, l'on entend par élevage des ruminants élevage des bovins (bœuf), des ovins (mouton) et des caprins(chèvre).

3. LES PARTICIPANTS

Les participants à l'atelier étaient au nombre d'environ vingt cinq (25) personnes, représentant 21 structures, réparties comme suit :

	Structures/Organisations Producteurs et Opérateurs	Nombre de Participants
1	Cabinet PRIVET	1
2	APEMC	1
3	APROCASUDE	2
4	APROLAIT SUD	1
5	CAPP/Bingerville	1
6	COLOPECI	1
7	Collectif des éleveurs du Nord (SCGEAN)	2
8	Coopérative Marché Bétail de Toumodi (CMBT)	1
9	Fédération des éleveurs du Nord (FEDEK)	1
10	Marché à Bétail de Boundiali	1
11	Usine Nord-Lait Korhogo	1
	S/Total	13

	Structures de Recherche, de Conseil et Projets	
12	CNRA	1
13	LANADA	1
14	Centre National Ovin (CNO)	1
15	ANADER	1
16	Projet Laitier Sud	1
	S/Total	5

	Administration et Structures étatiques	
17	MRS	1
18	MINAGRI	3
19	Ecole d'Elevage	1
20	BNETD	1
	S/Total	6

	FIRCA	
21	FIRCA	1
	S/Total	1

	TOTAL	25
--	--------------	-----------

4. RESULTATS DE L'ATELIER

4.1. Analyse des acteurs de la filière (ou des concernés)

Outre le FIRCA, l'atelier a identifié quarante cinq (45) acteurs de la filière des ruminants, répartis en neuf (09) catégories. L'analyse s'est arrêtée à la classification par grands groupes d'intérêt qui sont :

- Structure de conseil et de formation ;
- Prestataires de services ;
- Producteurs éleveurs
- Administration et Etat ;
- Structures de recherche ;
- Structures de commercialisation ;
- Structures de financement ;
- Structures de transformation et découpe ;
- Associations des consommateurs.

4.2. Analyse des problèmes

Elle a porté sur les problèmes et les contraintes de la filière des ruminants aussi bien sur ses aspects internes qu'externes. Il s'est agit d'identifier les blocages qui se posent au développement de la production de viande et de lait tant au niveau des éleveurs, de leurs organisations professionnelles que des institutions partenaires (Etat ou privés).

Les participants ont, au départ distingué, le lait des autres produits de l'élevage pour lequel deux (2) problèmes ont été identifiés :

- **Les unités de transformation de lait sont insuffisantes,**
- **La production de lait est insuffisante,**

Cette analyse a permis de mettre en évidence, à partir d'un problème central, des liaisons logiques de causes à effets entre les différentes causes.

Pour la filière des ruminants, le problème central identifié par les participants est le suivant :

"La production des ruminants (viande, lait) n'est pas suffisante".

Cette insuffisance s'explique par quatre (4) causes directes :

- Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) ne sont pas compétitifs (système de Dumping) ;
- La commercialisation des ruminants dans les marchés terminaux échappent aux nationaux ;
- Les Organisations Professionnelles d'Eleveurs ne sont pas fonctionnelles ;
- La productivité des élevages est très faible.

Pour chacune de ces causes directes, les participants ont identifié les sous-causes.

Pour "**Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) ne sont pas compétitifs (système de Dumping)**", l'atelier n'a pas identifié de sous-causes.

Pour "**La commercialisation des ruminants dans les marchés terminaux échappent aux nationaux**", l'atelier a identifié deux (2) sous - causes :

- * La réglementation sur les marchés à bétail n'est pas respectée ;
- * Le lobby qui domine ces marchés a un comportement "maffieux" ;

Pour "**Les Organisations Professionnelles d'Éleveurs ne sont pas fonctionnelles**", l'atelier a identifié deux (2) sous-causes :

- * Faible appui à la structuration des opérateurs des filières (OPE) ;
- * Insuffisance de la formation technique et économique ;

Pour "**La productivité des élevages est très faible**", l'atelier a identifié quatre (4) sous-causes :

- * Les performances des ruminants sont faibles ;
- * Le taux de mortalité des ruminants est élevé ;
- * Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents ;
- * Le mécanisme de transfert des acquis des projets n'est pas opérationnel ou fonctionnel.

Après les sous-causes, l'atelier a continué l'analyse des problèmes jusqu'à trois (3) niveaux de causes. C'est ainsi que l'on a pu constater que :

- *L'insuffisance de la formation technique et économique s'explique par l'insuffisance de l'appui au conseil des éleveurs due à son tour au fait que le financement de la filière et son mécanisme ne sont pas adaptés.*
- *Les performances des ruminants sont faibles parce que la valeur génétique des ruminants est faible du fait que les résultats de la recherche sont mal vulgarisés et que le financement de la filière des ruminants n'est pas adapté.*
- *Le taux de mortalité des ruminants est élevé parce que les intrants de production sont chers et il y a absence de maîtrise zoo-sanitaire et aussi parce que les éleveurs de bovins ne maîtrisent pas tous les outils de production.*
- *Les conflits entre éleveurs et agriculteurs sont fréquents parce que les pâturages sont insuffisants et parce que les ressources en eau sont insuffisantes.*

L'atelier n'a pas retenu l'insuffisance du pâturage naturel comme une cause de la mortalité des ruminants en Côte d'Ivoire. Cela serait plutôt valable pour les pays du Sahel.

Les principaux effets ou conséquences de l'insuffisance de la production de la filière des ruminants identifiés sont :

- **Les revenus des éleveurs de ruminants sont faibles.**
- **Les importations de produits carnés et laitiers demeurent importantes.**

4.3. Analyse des objectifs

C'est une étape méthodologique qui consiste à décrire, à partir des problèmes identifiés, les situations futures souhaitées et réalistes, après résolution des problèmes. Ce sont les Objectifs qui, hiérarchisés selon le concept moyens-fin, donnent un arbre des objectifs qui est la quasi-réplique positive des situations négatives représentées par l'arbre des problèmes. L'objectif principal correspondant au problème central a été formulé comme suit :

"La production des ruminants (viande, lait) est améliorée".

Ainsi, selon la logique des "moyens-fin" la réalisation de cet objectif est obtenue par celle des sous-objectifs suivants :

- Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) sont compétitifs (élimination du système de Dumping) ;
- L'implantation des nationaux dans la commercialisation des ruminants dans les marchés terminaux est renforcée ;
- Les organisations professionnelles d'Éleveurs sont fonctionnelles ;
- La productivité des élevages est améliorée.

Pour chacun de ses objectifs intermédiaires, l'atelier a également identifié la chaîne des sous-objectifs suivants :

Pour "**Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) sont compétitifs (système de Dumping)**", l'atelier n'a pas identifié de sous-objectifs.

Pour "**L'implication des nationaux dans la commercialisation des ruminants sur les marchés terminaux est renforcée**", l'atelier a identifié deux (2) sous-objectifs :

- * La réglementation sur les marchés à bétail est respectée ;
- * L'écoulement des produits des éleveurs nationaux est facilité sur les marchés terminaux.

Pour "**Les Organisations Professionnelles d'Éleveurs sont fonctionnelles**", l'atelier a identifié deux (2) sous-objectifs :

- * L'appui à la structuration des opérateurs des filières est assuré ;
- * La formation technique et économique des éleveurs est renforcée.

Pour "**La productivité des élevages est améliorée**", l'atelier a identifié quatre (4) sous-objectifs :

- * Les performances des ruminants sont améliorées ;
- * Le taux de mortalité des ruminants est réduit ;
- * Les rapports entre éleveurs et agriculteurs sont améliorés ;
- * Le mécanisme de transfert des acquis des projets est assuré.

Après les sous-objectifs, l'atelier a continué l'analyse des problèmes jusqu'à trois (3) niveaux d'objectifs. C'est ainsi que l'on a pu constater que :

- *La formation technique et économique est renforcée si l'appui conseil aux élevages est renforcé qui dépend à son tour du fait que le financement de la filière est adapté et que son mécanisme est fonctionnel.*
- *Les performances des ruminants sont améliorées si la valeur génétique des ruminants est améliorée qui dépend du fait que les résultats de la recherche sont bien vulgarisés et que le financement de la filière des ruminants est adapté.*
- *Le taux de mortalité des ruminants est réduit si les intrants de production sont accessibles, si les paramètres zoo-sanitaires sont maîtrisés et si les éleveurs de bovins maîtrisent tous les outils de production.*
- *Les rapports entre éleveurs et agriculteurs sont améliorés si les pâturages sont disponibles en toutes saisons et suffisante pour les ruminants et si les ressources en eau sont suffisantes.*

La finalité de l'amélioration de la production des ruminants (viande, lait) est :

- **Les revenus des éleveurs de ruminants sont améliorés.**
- **Les importations de produits carnés et laitiers sont réduites.**

4.4. Choix des alternatives de programmes

L'arbre global de l'analyse des objectifs (présenté en annexe) a servi de base pour le choix des objectifs qui pourront être poursuivis par le FIRCA, dans le cadre de ses missions et pour l'élaboration de son propre "Cadre Logique d'Intervention".

Dans le cas de la filière des ruminants, l'arbre des objectifs élaboré a été retenu pour être proposé au FIRCA. La similitude entre ces différents types d'élevages est telle que les problèmes, stratégies et objectifs sont les mêmes. Les participants de l'atelier maîtrisent tellement leur sujet qu'ils ont tout de suite cerné les problèmes réels qui se posent à la filière. L'ensemble des expériences de projets passés ont permis de circonscrire rapidement les débats.

4.5. Elaboration du Cadre Logique

La matrice du cadre logique, dans la méthodologie PPO, est l'élément de base de la planification qui permet d'indiquer pourquoi le programme ou projet est entrepris ; quels résultats le projet se propose d'atteindre ; comment le programme ou le projet compte atteindre ces résultats; quels sont les facteurs externes revêtant de l'importance pour le succès du projet; comment évaluer le succès du projet; où trouver les données nécessaires à l'évaluation du programme ou du projet et combien, coûtera le projet. Ainsi ce cadre logique se compose des éléments ci-dessous :

- Les Objectifs Globaux ;
- L'Objectif de la Filière ;
- les Résultats ;
- les Activités ;
- les Facteurs Externes ou Hypothèses ;
- les Indicateurs Objectivement Vérifiables ;
- les Sources de Vérification des Objectifs.

Les résultats issus des travaux de l'atelier, pour ces différentes composantes, sont présentés ci-dessous :

4.5.1. Objectifs Globaux

Pour le secteur de l'élevage des ruminants les Objectifs Globaux définis sont :

- **Les revenus des éleveurs de ruminants sont améliorés.**
- **Les importations de produits carnés et laitiers sont réduites.**

Notons à ce niveau, qu'il y avait un troisième objectif global sur la balance commerciale de la Côte d'Ivoire en terme de produits carnés et laitiers. L'atelier lui a préféré celui sur les importations pour mettre un accent sur celles-ci afin d'attirer l'attention des décideurs.

4.5.2. Objectif de la filière des ruminants

Cet objectif constitue la finalité du Plan d'Action. C'est l'objectif sur lequel le FIRCA s'engage pour la période de planification considérée, c'est-à-dire pour les six prochaines années. Il est la réponse aux préoccupations des producteurs éleveurs en vue du développement de la filière des ruminants.

Les participants ont identifié un Objectif de la Filière qui est ainsi libellé :

"La production des ruminants (viande, lait) est améliorée".

Pour atteindre cet objectif, des volets ou grandes composantes issus de l'analyse des problèmes ont été définis comme objectifs intermédiaires. Ces objectifs intermédiaires sont appelés "Résultats" dont la réalisation est nécessaire pour atteindre l'Objectif pour lequel ils ont été définis.

4.5.3. Résultats

Ils sont induits par la réalisation des activités et s'inscrivent dans la logique des relations moyens-fins. Les changements souhaités qu'ils occasionnent peuvent être à court ou moyen terme. Pour le secteur de l'élevage des ruminants, les Résultats attendus pour la réalisation de l'objectif de la filière identifié sont :

- **R1** : La productivité des élevages est améliorée ;
- **R2** : Les produits d'élevage (viande, lait) sont compétitifs ;
- **R3** : Les organisations professionnelles des éleveurs (OPE) sont fonctionnelles ;
- **R4** : L'implication des nationaux dans la commercialisation des ruminants sur les marchés ;
terminaux est renforcée.

4.5.4. Les Activités

Les activités sont les mesures individuelles prises pour atteindre un résultat. Pour la présente planification, ce sont les activités principales qui ont été identifiées. Elles correspondent dans l'ensemble à autant de projets ou dans certains cas de programmes spécifiques dont le développement peut donner naissance à d'autres projets. Les activités identifiées serviront donc de base au choix des actions à mener dans la première phase de deux (2) ans par le FIRCA (Annexe 2).

4.5.5. Les Facteurs Externes

Les facteurs externes sont des objectifs dont la réalisation est importante pour l'atteinte des objectifs et des résultats prévus dans le Plan, mais dont la responsabilité échappe au FIRCA. Pour la filière Elevage des Ruminants, les facteurs suivants issus de l'analyse des objectifs et après leur évaluation, ont été mentionnés dans le cadre logique (Annexe 1):

Au niveau de l'objectif de la filière : **La production des ruminants (viande, lait) est améliorée.** Cela ne sera possible que si par ailleurs **les accords de l'OMC sont assouplis.**

4.5.6. Les Indicateurs

Les indicateurs sont des éléments objectifs et consensuels qui permettent le contrôle interne et externe du projet ou du programme, la mesure des changements souhaités chez le groupe cible, tout en servant de base pour l'élaboration d'un système de suivi et d'évaluation.

Les participants ont formulé des indicateurs pour les Objectifs Globaux, l'Objectif de la filière et pour l'ensemble des résultats (Annexe 1).

4.5.7. Choix des actions–projets et élaboration des fiches projets

Sur les trente trois (33) activités principales identifiées, les participants ont retenu six (6) activités prioritaires, comme projets réalisables par le FIRCA, pour contribuer à l'amélioration de la production nationale des ruminants au cours des deux prochaines années. Ces six (6) projets prioritaires sont présentés sous forme de fiches projets en annexe. Ce sont :

Projet 1 :	Renforcement des programmes d'amélioration génétique
Projet 2 :	Etude sur les pathologies majeures des ruminants
Projet 3 :	Appui à la mise au point de formules alimentaires efficaces
Projet 4 :	Appui au conseil aux éleveurs de ruminants
Projet 5 :	Formation des éleveurs
Projet 6 :	Appui au financement des élevages de ruminants

5. CONCLUSION

L'atelier s'est déroulé avec une moyenne constante de vingt cinq (25) personnes. Ce nombre important de participants a quelques fois été un handicap vu les discussions souvent longues et les positions tranchées. La participation a été active tant du côté des responsables de l'administration, des experts de l'élevage des ruminants que surtout des producteurs éleveurs eux-mêmes. Ces derniers n'ont pas hésité à donner leurs points de vue sur les sujets au risque même d'être en contradiction avec leurs collègues.

Une des particularités de cette filière est que toutes les activités identifiées relèvent des domaines d'intervention du FIRCA. Ce qui permet de dire que les acquis des projets passés de cette filière doivent être capitalisés pour mieux servir l'ensemble des acteurs de la filière.

**ATELIER DE PLANIFICATION DES ACTIVITES
DE LA FILIERE ELEVEAGE DES RUMINANTS**

Hôtel IBIS – Plateau : 10- 12 août 2004

ANNEXES

Documents de l'Atelier


Annexe 1 : CADRE LOGIQUE

Description sommaire	Indicateurs O. V.	Sources de vérification	Suppositions Importantes
Objectif Global: Les revenus des éleveurs de ruminants sont améliorés et les importations de produits carnés et laitiers sont réduites	Le taux d'importation - de viande passe de ... à ... - de lait passe de ... à ...	Statistiques douanières	
Objectif du Projet La production des ruminants (viande, lait) est améliorée	- Après deux ans, le niveau de production nationale de viandes de ruminants passe de 40% à 60%	Statistiques nationales	- Les accords de l'OMC sont assouplis
R1 Résultats du Projet La productivité des élevages est améliorée	Après deux ans, le niveau de production nationale de lait augmente de 20% Après deux ans, le rendement carcasse passe de : - 30% à 40% pour les ovins/caprins - 55% à 60% pour les bovins	Registres d'abattoir Cahiers de traite	
R2 Les produits d'élevage (viande, lait) sont compétitifs	- Après deux ans, la quantité de lait trait par vache passe de 5 litres à 10 litres/jour	Statistiques nationales	
R3 Les organisations professionnelles des éleveurs (OPE) sont fonctionnelles	- Après deux ans, les activités statutaires de x% des O.P.E sont assurées -	Procès verbaux des réunions	
R4 L'implication des nationaux dans la commercialisation des ruminants sur les marchés terminaux est renforcée	- Après deux ans, au moins 80% de la production nationale est écoulee - Deux ans après le démarrage du projet, X% de producteurs nationaux écoulent leurs produits d'élevage sur les marchés terminaux	Rapports d'activités Registres de vente	

Annexe 2 : ACTIVITES

R1 : La productivité des élevages est améliorée	R2 : Les produits d'élevage (lait et viande) sont compétitifs	R3 : Les organisations professionnelles des éleveurs (OPE) sont fonctionnelles		R4 : L'implication des nationaux dans la commercialisation des ruminants est renforcée
11. Former les Eleveurs à la conduite de l'élevage	21. Renforcer les capacités de transformation des productions	31. Renforcer les capacités des organisations professionnelles d'Elevage	32. Faciliter l'accès au Crédit à l'élevage des ruminants (Fonds de garanti, etc. ...)	41. Faire la promotion des produits existants
12. Renforcer les capacités de recherche sur les ruminants	22. Faire l'étude sur la consommation des produits locaux	311. <i>Identifier les besoins en formation technique et économique des éleveurs de ruminants</i>	33. Aider les OPE à acquérir les matériels nécessaires à leur fonctionnement	42. Organiser au sein des OPE la collecte de la production et la vente groupée sur les marchés terminaux
13. Mettre en place un mécanisme d'appui/conseil spécifique aux éleveurs	23. Promouvoir la consommation des productions locales	312. <i>Former les OPE aux principes coopératifs</i>	34. Recenser les études réalisées sur le financement de la filière des Ruminants	43. Reprendre et vulgariser les expériences de mise en marché
14. Renforcer les programmes d'amélioration génétique	24. Former les éleveurs à la gestion technico-économique	313. <i>Former les OPE à maîtriser les lois qui les régissent</i>	35. Organiser les états généraux de l'élevage des ruminants	44. Créer un réseau de communication (écoulement des produits facilité, échanges entre éleveurs, etc.)
15. Faire des études sur les pathologies majeures des ruminants	25. Former les producteurs à produire la qualité	314. <i>Organiser des voyages d'études auprès d'OPA Expérimentées</i>	36. Organiser des rencontres périodiques des acteurs de la filière (Journée de l'Eleveur)	45. Faire des études sur les opportunités de création de marchés primaires par région
16. Vulgariser les résultats de la recherche	26. Réaliser une étude sur la compétitivité de la filière des Ruminants	315. <i>Organiser des sessions de formations en comptabilité et prise de décision</i>		46. Faire respecter la réglementation sur les marchés
161. <i>Vulgariser l'insémination artificielle</i>		316. <i>Former les OPE en recherche de financement</i>		
162. <i>Mettre au point des formules alimentaires efficaces</i>				
163. <i>Vulgariser les espèces fourragères sélectionnées</i>				

Annexe 3 :
Analyse des problèmes

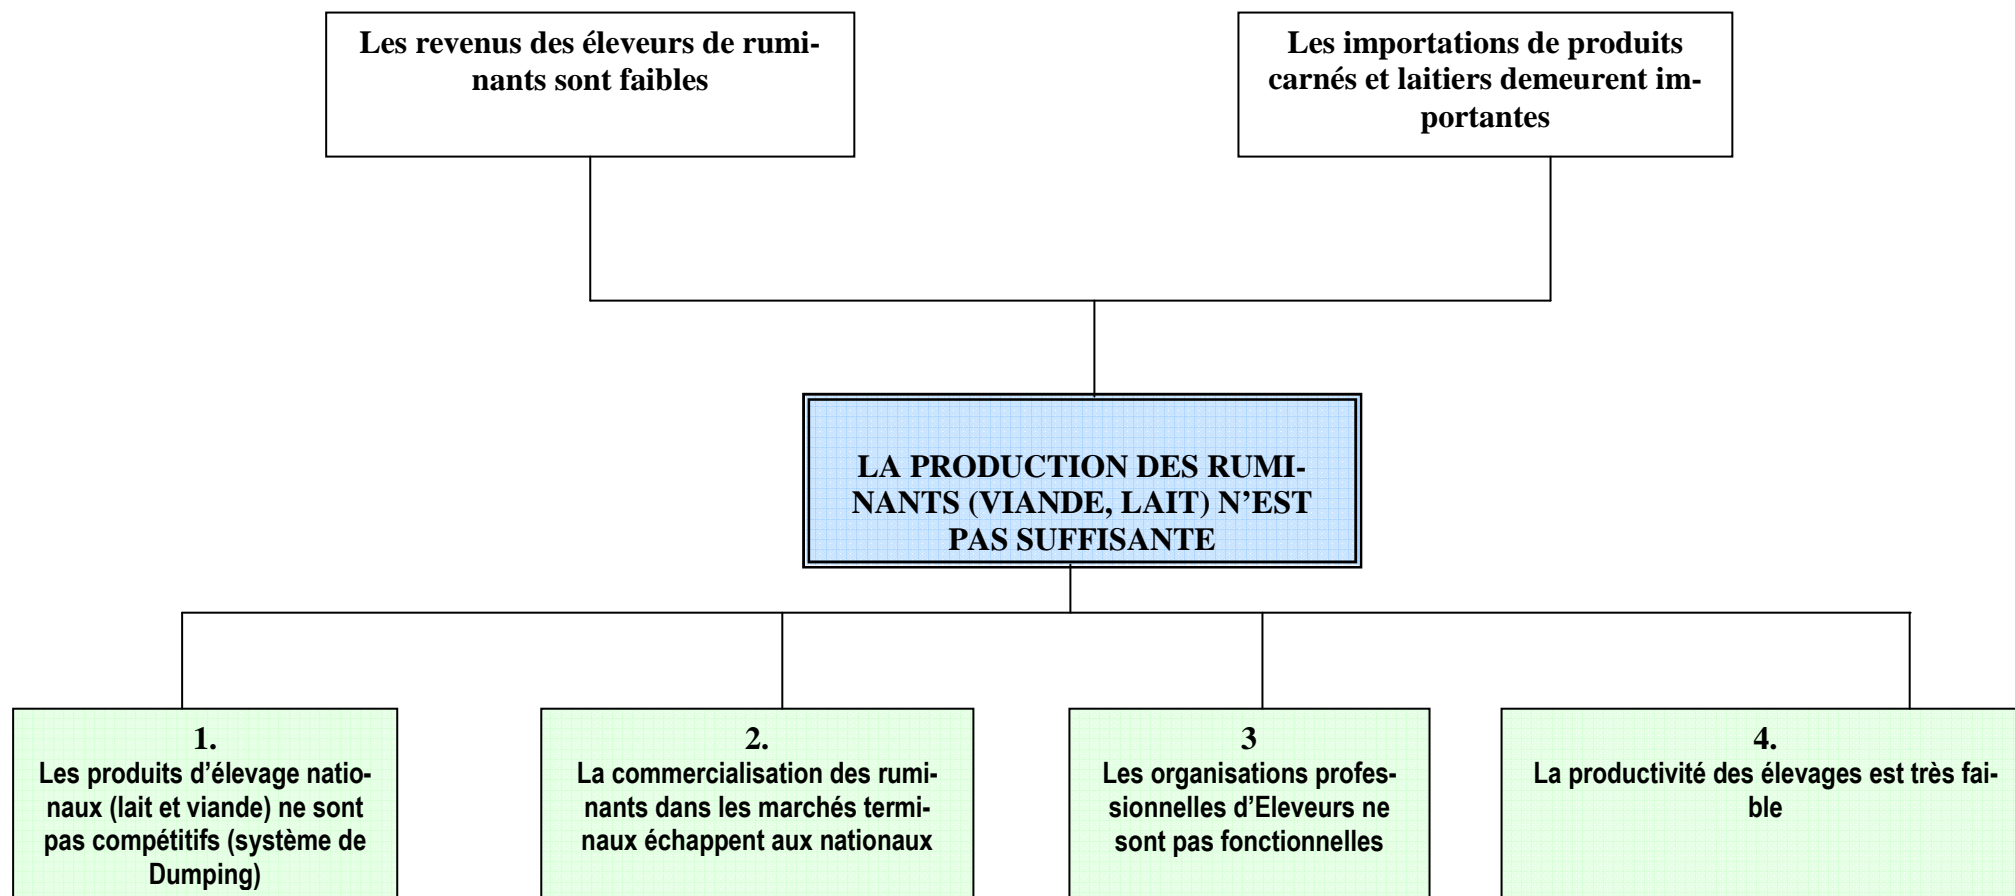

1.
Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) ne sont pas compétitifs (système de Dumping)

2.
La commercialisation des ruminants dans les marchés terminaux échappent aux nationaux

21. La réglementation sur les marchés à bétail n'est pas respectée


22. Le lobby qui domine ces marchés a un comportement "maffieux"

3.
Les organisations professionnelles d'Éleveurs ne sont pas fonctionnelles


32. Insuffisance de la formation technique et économique

31. Faible appui à la structuration des opérateurs des filières (OPE)

4.
La productivité des élevages est très faible

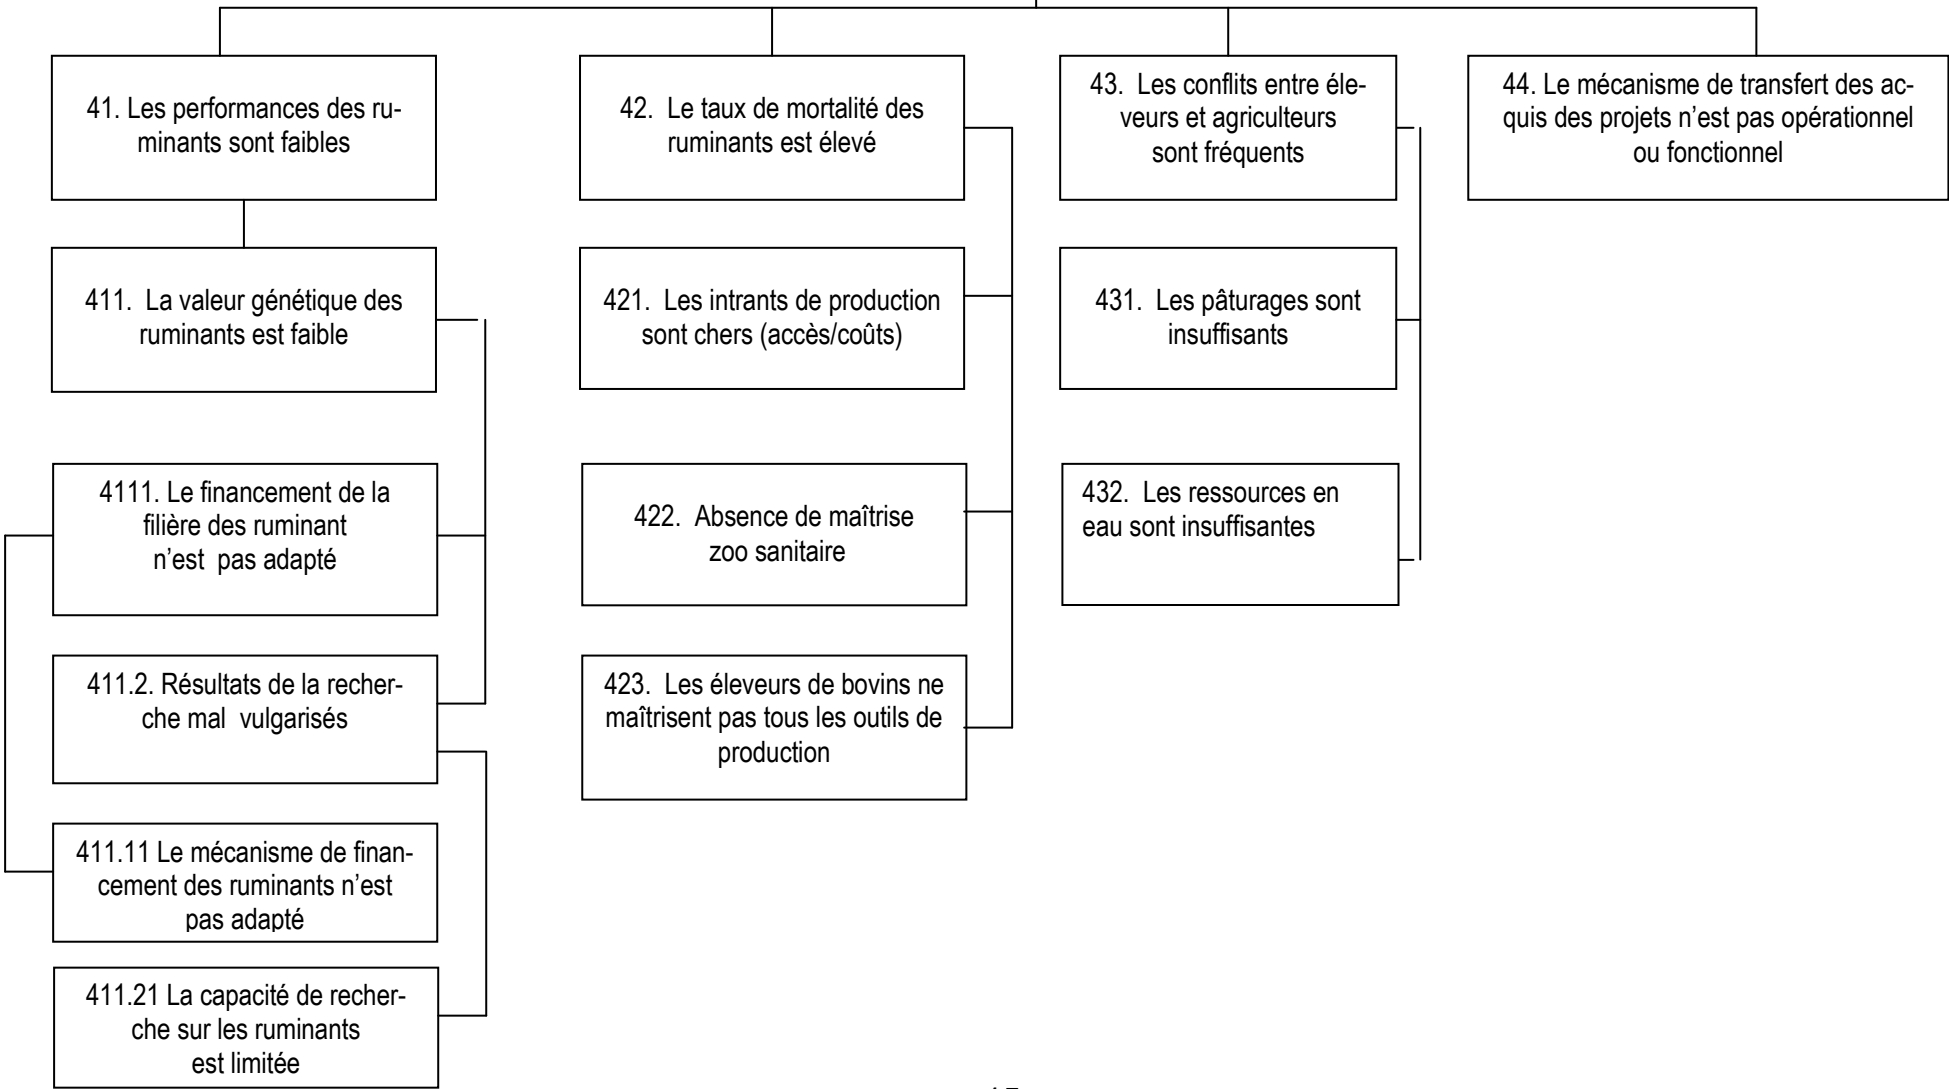

Annexe 4 : Analyse des Objectifs

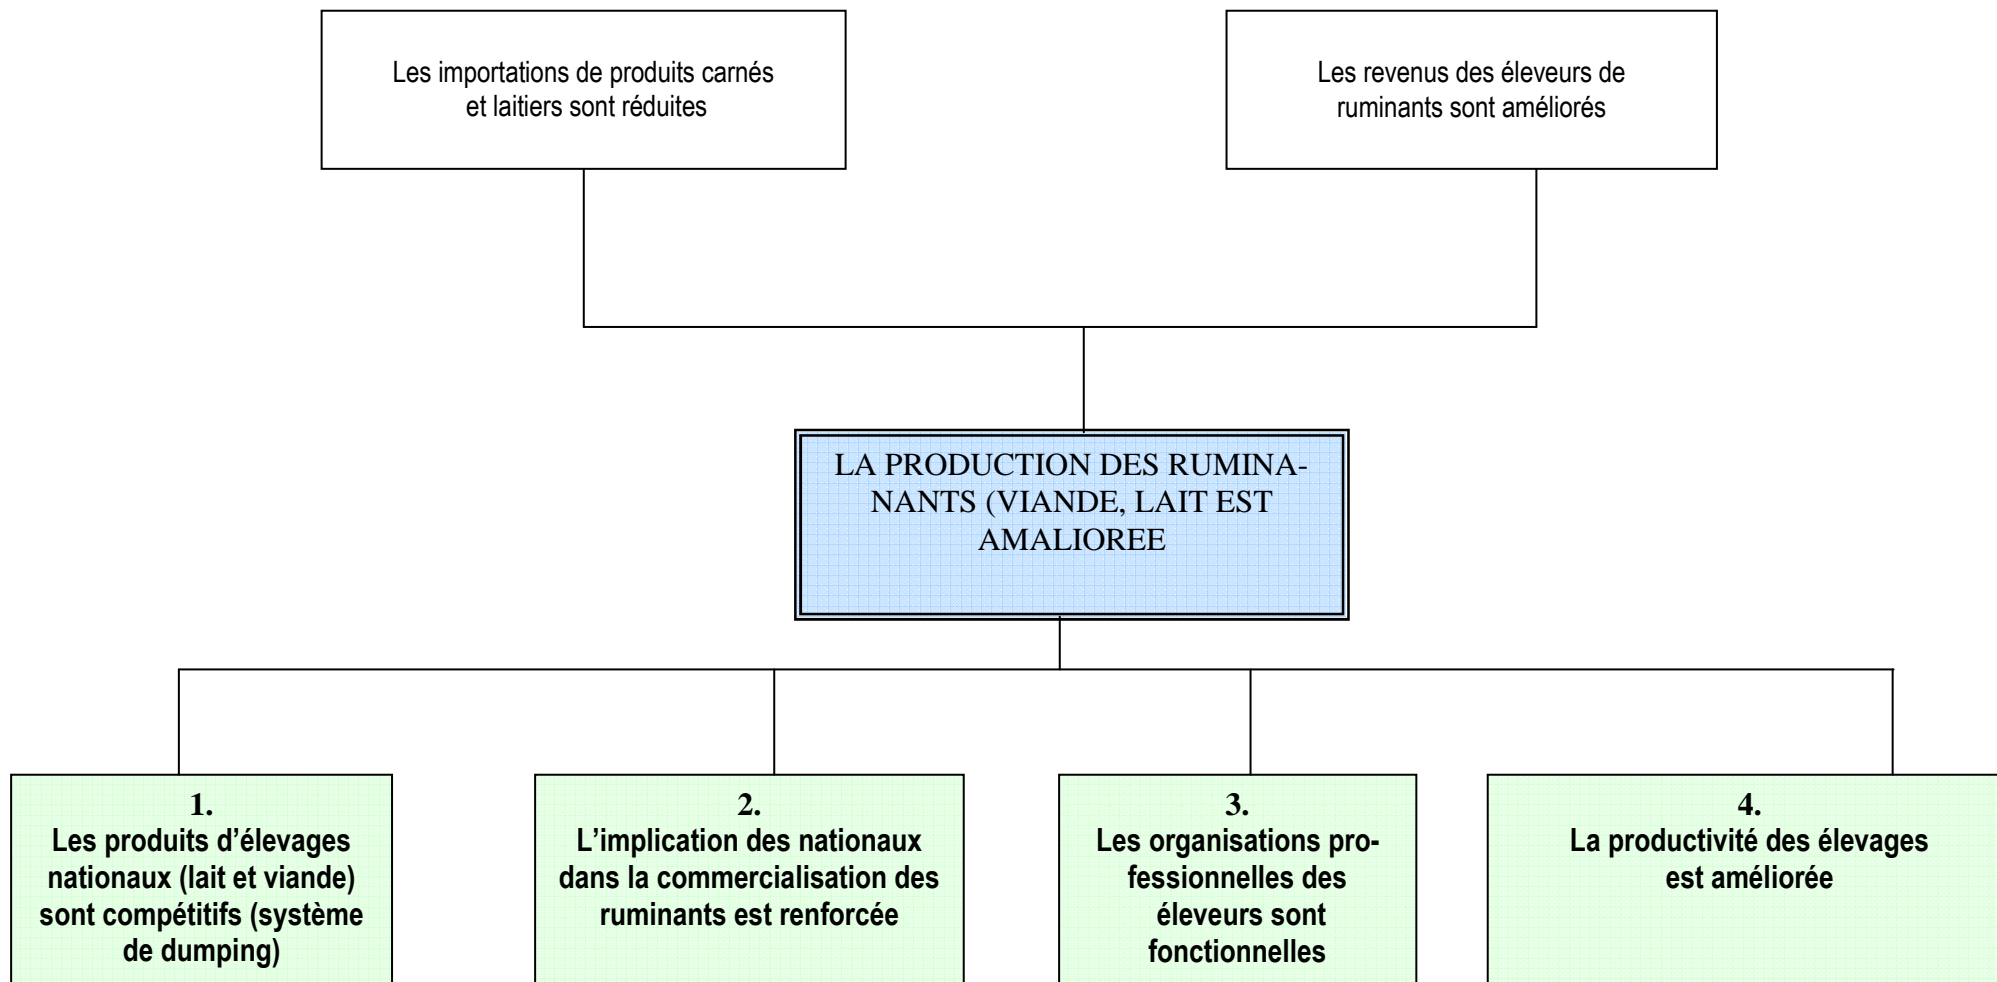

1.
Les produits d'élevage nationaux (lait et viande) sont compétitifs (Système de Dumping)

2.
L'implantation des nationaux dans la commercialisation des ruminants dans les marchés terminaux est renforcée

21. La réglementation sur les marchés à bétail est respectée

22. L'écoulement des produits des éleveurs nationaux est facilité sur les marchés terminaux


3.
Les organisations professionnelles d'Éleveurs sont fonctionnelles

31. L'appui à la structuration des opérateurs de la filière est assuré

32. La formation technique et économique des éleveurs est renforcée

321. L'appui conseil aux élevages de ruminants est renforcé

**4.
La productivité des élevages est améliorée**

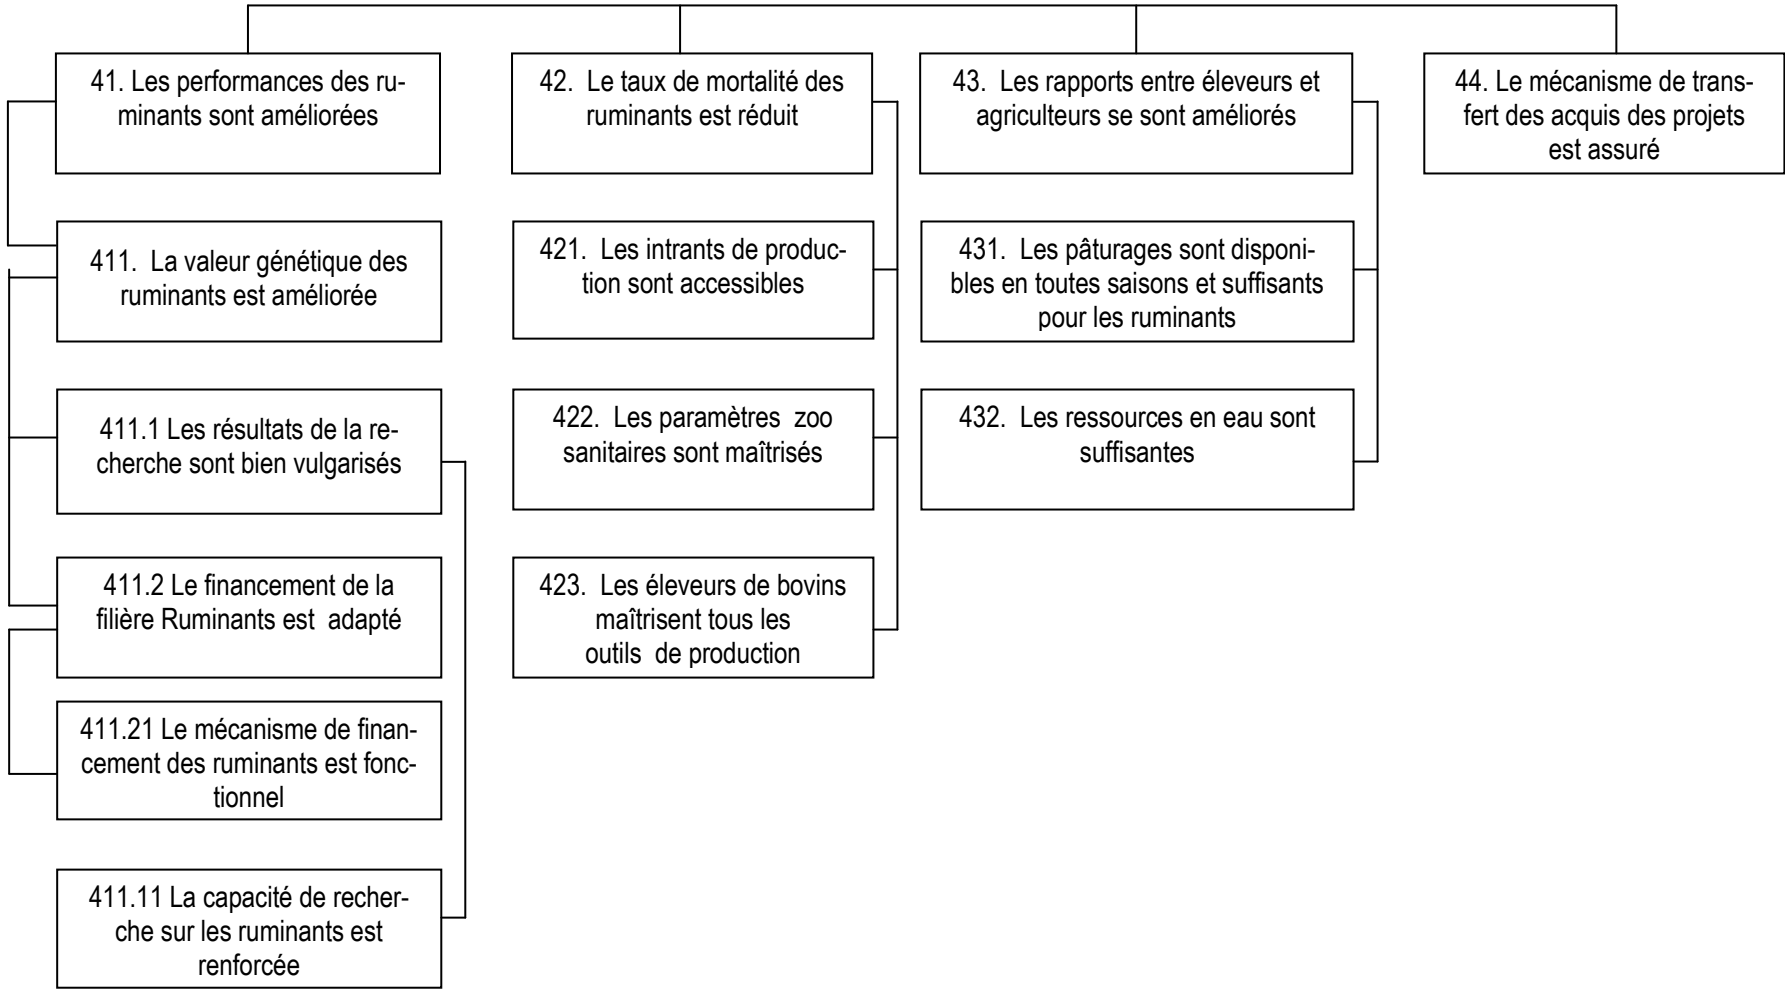

Annexe 5: Analyse des concernés

STRUCTURE DE FINANCEMENT	STRUCTURE DE TRANSFORMATION	STRUCTURE DE RECHERCHE	STRUCTURE DE COMMERCIALISATION
FIRCA	Abattoirs municipaux	CNO (Centre Nationale Ovin)	Comité du Marché à Bétail CMB Boundiali
Banques	Bouchers	PNSO	Coopérative du Marché à bétail de Toumodi CMBT'
Partenaires au Développement	PROLAIT (Entreprise de transformation)	AISA (Association Ivoirienne des Sciences Agronomiques)	Chevillards
Institutions de Micro finance	SICS (Charcuterie de bœuf)	CNRA	Braiseurs de viande de ruminants
Conseils généraux (financement)	NORMANDIA (Produits laitiers divers)	Ranchs et Stations d'Etat	Points de vente Lait
			Le « Lobby » du marché de Port Bouet.

ADMINISTRATION / ETAT	PRODUCTEUR ELEVEUR	PRESTATAIRES DE SERVICES	STRUCTURE DE CONSEIL/FORMATION
MRS	Fédération des éleveurs département de Korhogo	LANADA (Laboratoire National d'Appui au Développement Agricole)	ANADER (Agence National d'Appui au Développement Rural)
Ministère de la Production Animale et des Ressources Halieutiques	APEMC	COOMACI (Coopérative pour le Machinisme en Côte d'Ivoire)	SCGEAN (Service de Compatibilité et de Gestion des Exploitations du Nord)
PACE-CI (Programme Panafricain de Contrôle des Epizooties en Côte d'Ivoire)	APROLAIT – Sud (Association des Eleveurs Laitiers du Sud de la CI)	Transporteurs	Les centres de Gestion des exploitations
Projet BAD II Elevage	APROCASUDE (Ovins – Caprins) Sud - Est Forestier RCI	Cabinets Vétérinaires	BNETD
Projet Lait Sud	Collectif des éleveurs du Nord CEN KORHOGO	Association des Vétérinaires Privés et Praticiens de CI AVPPCI	Les centres de formation
	COLOPECI (ex COLOPEC) Collectif des Organisations Professionnelles des Eleveurs de CI (Faïtière)	Importateurs de médicaments vétérinaires	Ecole d'Elevage du CNO
	MUBOCI (Mutuelle des Boviculteurs de CI)	Producteurs d'aliment de Bétail	

Annexe 6

**FICHES PROJETS ET COUT DU PROGRAMME OPERATIONNEL
2005-2006**

FONDS INTERPROFESSIONNEL POUR LA RECHERCHE ET LE CONSEIL AGRICOLE

FILIERE RUMINANTS

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROJETS

N°	Référence	Projets	Coûts (FCFA)
		Recherche	
1	Re	Renforcement des programmes d'amélioration génétique	181 733 250
2	Re	Etude sur les pathologies majeures des ruminants	84 868 300
3	Re	Appui à la mise au point de formules alimentaires efficaces	234 419 000
		Sous Total Recherche	501 020 550
		Conseil agricole	
4	Co	Appui conseil aux éleveurs de ruminants	231 920 400
		Sous Total Conseil agricole	231 920 400
		Formation	
5	Fo	Formation des éleveurs	171 000 000
		Sous Total Formation	171 000 000
		Renforcement des OPA	
		Sous Total OPA	
		Etude et Appui Institutionnel	
6	Etude	Appui au financement des élevages de ruminants	215 000 000
		Sous Total Etude et Appui Institutionnel	215 000 000
		TOTAL GENERAL	1 118 940 950

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 01/2005 - 2006
Intitulé du projet : RENFORCEMENT DES PROGRAMMES D' AMELIORATION GENETIQUE	
1. Orientation	<i>Améliorer la production des ruminants (viande et lait)</i>
2. Objectifs	- Améliorer les performances zootechniques des ruminants
3. Description de l'état actuel	- Des tentatives d'amélioration ont eu lieu mais elles n'ont pas donné les résultats escomptés - Les ressources humaines existent
4. Contraintes	- Ressources financières limitées - Les laboratoires de recherche et centres sont sous-équipés
5. Population bénéficiaire	- Les producteurs - éleveurs de ruminants
6. Stratégie de Mise en œuvre	- Par croisements génétiques (monte naturelle, transplantation embryonnaire et insémination artificielle) - Constituer des réseaux de producteurs pour les essais multi locaux
7. Actions passées ou en cours	Expériences sur les projets - PANYA (Boundiali) - CNIA (Bingerville) - PALME (Boundiali) - NIORONIGUE - Ranch de la Marahoué - CNRA (Ex IDESSA)
8. Activités proposées	- Identifier les ressources génétiques existantes - Faire l'état des lieux de l'existant - Identifier les centres pilotes du projet - Appui à l'équipement des laboratoires et centres de Recherche
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- Laboratoires et centres de recherche
12. Partenaires	- Les ONGs - Les bailleurs de fonds - Les OPE
13. Coût prévisionnel	- 181 733 250 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	A déterminer
15. Source de Financement	FIRCA
16. Charges récurrentes	A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- Une base de données est constituée au plus tard à la fin du premier trimestre du projet
- Un répertoire des races bovines, ovines et caprines est élaboré au plus tard à la fin du premier semestre du projet
- Les centres pilotes sont évalués au plus tard à la fin du premier semestre du projet
- Les laboratoires et Centres de Recherche sont équipés au premier trimestre du projet
- L'ensemble du personnel scientifique est formé au premier trimestre du projet
- Les éleveurs chercheurs sont formés au deuxième trimestre du projet

FILIERE RUMINANTS				
Projet N° 01/2005-2006 : Renforcement des programmes d'amélioration génétique				
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCA)
I. CONSTITUTION DE RESEAUX DE PRODUCTEURS				
1.1 Identifications des éleveurs	H/jour	90	67 625	6 086 250
Sous Total (I)				6 086 250
II. CONSTITUTION DE BASE DE DONNEES				
II.1 Conception et mise en service	Forfait	1	10 000 000	10 000 000
Sous Total (II)				10 000 000
III. Identification des ressources génétiques existants				
3.1 Etat des lieux	H/J	90	62 450	5 620 500
3.2 Caractérisation biochimique et moléculaires	Nombre	500	35 710	17 855 000
Sous Total (III)				23 475 500
IV. IDENTIFICATION DES CENTRES PILOTES				
4.1 Evaluation de l'existant dans les centres	Nombre	10	1 266 000	12 660 000
SousTotal (IV)				36 135 500
V. APPUI A L'EQUIPEMENT DES LABORATOIRES ET CENTRES DE RECHERCHE				
5.1 Petits équipements de laboratoire	Nombre	2	1 300 000	2 600 000
5.2 Equipements d'insémination artificielle	Forfait	1	20 000 000	20 000 000
5.3 Centrifugeuse SPEED - VAC	Nombre	1	45 000 000	45 000 000
Sous Total (V)				67 600 000
VI. RENFORCEMENT DES CAPACITES				
6.1 Formation des éleveurs	H/J	90	60 400	5 436 000
6.2 Formation du personnel scientifique	H/M	3	2 000 000	6 000 000
6.3 Matériel d'identification	Forfait	1	15 000 000	15 000 000
Sous Total (VI)				26 436 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III+IV+V+VI				169 733 250
VII. GESTION DU PROJET				
7.1 Etude faisabilité	H/M	1	4 000 000	4 000 000
7.2 Suivi-évaluation	H/M	1	4 000 000	4 000 000
7.3 Appui à l'exécution du projet	H/M	1	4 000 000	4 000 000
Sous Total (VII)				12 000 000
TOTAL GENERAL				181 733 250

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 02/2005 - 2006
Intitulé du projet : PROJET D' ETUDE SUR LES PATHOLOGIES MAJEURES DES RUMINANTS	
1. Orientation	<i>Améliorer la production des ruminants (viande et lait)</i>
2. Objectifs	Maîtriser les pathologies majeures des ruminants
3. Description de l'état actuel	Les études sont à l'état embryonnaire
4. Contraintes	- Faible niveau de connaissance des maladies des élevages - Faible niveau d'équipement des laboratoires - Ressources financières limitées
5. Population bénéficiaire	- Les cabinets vétérinaires privés - Les producteurs – éleveurs de ruminants - Les auxiliaires de santé animale - Les bouviers et bergers
6. Stratégie de mise en œuvre	- Constituer des équipes pluridisciplinaires - Rechercher la collaboration des institutions spécialisées externes - Constituer des réseaux de producteurs pour les essais multi locaux
7. Actions passées ou en cours	- Etude sur l'âge de la primo vaccination des agneaux contre la PPR (réalisée) - Essais de traitement antibiotique de la PPCB (voire l'effet du traitement sur la formation des séquestres pulmonaires) en cours - Essais de traitement des puces du mouton (<i>Ctenocephalides felis</i>)
8. Activités proposées	- Diagnostic épidémiologique - Recherche de nouvelles thérapeutiques - Mise au point de schémas thérapeutiques
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- Les laboratoires et centres de recherche
12. Partenaires	- Les laboratoires internationaux - Les bailleurs de fonds (PNUD, etc...) - Les OPE - Les ONGs - Les cabinets vétérinaires privés
13. Coût prévisionnel	- 84 868 300 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	- A déterminer
15. Source de Financement	- FIRCA
16. Charges récurrentes	- A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- Le diagnostic épidémiologique est établi au plus tard à la fin de la première année du projet
- De nouvelles thérapeutiques sont mises au point au plus tard au troisième trimestre de la deuxième année du projet
- Le personnel d'appui conseil ainsi que les éleveurs des OPE sont formés sur les pathologies et les nouvelles thérapeutiques au cours du dernier trimestre du projet

FILIERE RUMINANTS				
Projet N° 02/2005-2006 : Etude des pathologies majeures des ruminants (prévention parasitaire)				
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantité	CU(FCFA)	CT(FCFA)
I. DIAGNOSTIC EPIDEMIOLOGIQUE				
1.1 Recherche des parasites gastro-intestinaux	Echantillon	1 800	9 806	17 650 800
1.2 Analyse coprologique	Echantillon	1 800	10 000	18 000 000
1.3 Autopsies	Animaux	100	70 000	7 000 000
Sous Total (I)				42 650 800
II. RECHERCHE DE NOUVELLES THERAPEUTIQUES ANTIPARASITAIRES				
2.1 Revue bibliographique	H/M	1	3 600 000	3 600 000
2.2 Test d'efficacité	Echantillon	100	146 175	14 617 500
2.3 Schémas de prévention parasitaire	Forfait			0
Sous Total (II)				18 217 500
III. RENFORCEMENT DES CAPACITES				
3.1 Formation	H/Mois	6	2 000 000	12 000 000
Sous Total (III)				12 000 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				72 868 300
IV. GESTION DU PROJET				
4.1 Etude de faisabilité	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
4.2 Suivi- évaluation	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
4.3 Appui à l'exécution du projet	H/Mois	1	4 000 000	4 000 000
Sous Total (IV)				12 000 000
TOTAL GENERAL				84 868 300

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 03/2005 - 2006
Intitulé du projet : PROJET D'APPUI A LA MISE AU POINT DE FORMULES ALIMENTAIRES EFFICIENTES	
1. Orientation	Améliorer la production des ruminants (viande et lait)
2. Objectifs	Améliorer la qualité de l'alimentation des ruminants
3. Description de l'état actuel	- Existence de formules pour la production laitière et de viandes insuffisamment adaptées (selon les régions) - Existence d'espèces fourragères sélectionnées pas encore vulgarisées
4. Contraintes	- Coût des matières premières (tourteau de soton, palmiste, Soja, etc...) - Non disponibilité des matières premières en toute saison - Coût élevé des analyses chimiques des matières premières
5. Population bénéficiaire	- Les industries de production d'aliments de bétail (les provendiers) - Les OPE - Les producteurs - éleveurs
6. Stratégie de mise en œuvre	- Mise au point de protocoles expérimentaux - Composition d'une équipe pluridisciplinaire - Valorisation des espèces fourragères sélectionnées
7. Actions passées ou en cours	- Formules alimentaires pour la production laitière (Projet Lait-Sud – CRZ) - Formules alimentaires pour la production de viande (Ex IDESSA)
8. Activités proposées	- Faire l'analyse bromatologique (chimique) des matières premières - Mettre au point les formules alimentaires - Tester les formules alimentaires en stations et dans les fermes pilotes - Etudier le développement et la gestion des pâturages (artificiels et naturels)
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- Laboratoires et centres de recherche
12. Partenaires	- Les laboratoires et centres de recherche - Les ONG - Les bailleurs de fonds - Les cabinets vétérinaires privés
13. Coût prévisionnel	- 234 419 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	Néant
15. Source de financement	FIRCA
16. Charges récurrentes	A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- Des bâtiments d'élevage sont construits et équipés au plus tard à la fin du premier trimestre du projet
- Les tables de valeurs sont actualisées au plus tard à la fin du troisième trimestre du projet
- Le personnel d'appui conseil et les éleveurs sont formés sur les nouvelles formules au cours du dernier trimestre du projet

FILIERE RUMINANTS				
Projet N° 03/2005-2006 : Appui à la mise au point de formules alimentaires efficaces				
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCFA)
I. ACTUALISATION DES TABLES DE VALEURS				
1.1 Tables de valeurs et sous produits	H/mois	4	3 600 000	14 400 000
1.2 Analyse bromatologique d'échantillons	Nombre	100	56 000	5 600 000
2.3 Conduite d'essais en station	H/mois	10	3 600 000	36 000 000
1.4 Acquisition d'animaux d'essais	Nombre	50	200 000	10 000 000
1.5 Essais en milieu paysan	Nombre	5	1 839 000	9 195 000
1.6 Développement et gestion des pâturages	H/mois	5	3 600 000	18 000 000
Sous Total (I)				93 195 000
II. APPUI A L'EQUIPEMENT DES LABORATOIRES DE RECHERCHE				
2.1 Equipements de labo de nutrition	Forfait	1	105224000	105 224 000
2.2 Equipements bâtiments d'élevage	Forfait	1	12 000 000	12 000 000
Sous Total (II)				117 224 000
III RENFORCEMENT DE CAPACITE				
3.1 Formation	H/mois	6	2 000 000	12 000 000
Sous Total (III)				12 000 000
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				222 419 000
IV. GESTION DU PROJET				
4.1 Etude de faisabilité	H/M	1	4 000 000	4 000 000
4.2 Suivi -Evaluation	H/M	1	4 000 000	4 000 000
4.3 Appui à l'exécution du projet	H/M	1	4 000 000	4 000 000
Sous Total (IV)				12 000 000
TOTAL GENERAL				234 419 000

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 04/2005 - 2006
Intitulé du projet : APPUI CONSEIL AUX ELEVEURS DE RUMINANTS	
1. Orientation	<i>Améliorer la production des ruminants (viande et lait)</i>
2. Objectifs	Optimiser les moyens de production par les éleveurs
3. Description de l'état actuel	- L'ANADER, les Cabinets vétérinaires privés, les ONGs font de l'appui /conseil, mais le service de proximité touche un nombre limité d'éleveurs
4. Contraintes	- L'implication de l'éleveur dans la gestion de son élevage - Le non respect des engagements pris
5. Population bénéficiaire	- Eleveurs de ruminants
6. Stratégie de mise en œuvre	- Analyse des besoins en appui / conseil
7. Actions passées ou en cours	- SODEPRA – ANADER - Cabinets vétérinaires privés
8. Activités proposées	- Mettre en place un mécanisme d'appui conseil spécifique aux éleveurs - Vulgariser l'insémination artificielle - Vulgariser les espèces fourragères sélectionnées - Vulgariser les résultats de la recherche
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- A déterminer
12. Partenaires	
13. Coût prévisionnel	- 231 920 400 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	- Néant
15. Source de financement	- FIRCA
16. Charges récurrentes	- A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- 120 CSE sont formés (mise à niveau)
- 50 CSE sont formés aux techniques d'insémination artificielle
- 100 agro éleveurs sont formés aux techniques d'insémination artificielle
- 120 CSE sont formés sur les espèces fourragères
- 100 agro éleveurs sont formés sur les espèces fourragères

FILIERE RUMINANTS					
Projet N° 04/2005-2006 : Appui conseil aux éleveurs					
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCFA)	Observations
1- Mise en place d'un mécanisme d'appui conseil spécifique					
1.1- Atelier de mise à niveau à l'encadrement rapproché des CSE	Nombre	2	5 000 000	10 000 000	120 CSE x 6 jours/ 2 ans
1.2- Equipement des CSE en KIT	Nombre	60	577 000	34 620 000	
1.3- Fonctionnement pour la mise en œuvre de l'appui conseil	Nombre	24	1 200 000	28 800 000	20 000Fx 60 motos/2 ans
1.4- Atelier d'échanges périodiques avec les OPE	Nombre	4	1 000 000	4 000 000	25 pers x 4 séances/2 ans
1.5- Elaboration fiches techniques d'élevage	fiches	1000	6 000	6 000 000	25 éleveurs x 60
Sous Total (I)				83 420 000	localités x 4 modèles de fiches
II- Vulgarisation de l'insémination artificielle					
2.1- Ateliers de sensibilisation et de formation des agro-éleveurs	Nombre	4	2 141 700	8 566 800	100 agro éleveurs pendant 6 jours/ an
2.2- Formation des CSE aux techniques d'insémination artificielle	Nombre	2	2 141 700	4 283 400	50 CSE pendant 6 jours /an
2.3- Equipements des CSE en trousse d'IA	Trousses	60	700 000	42 000 000	60
2.4- Appui à la mise en œuvre des activités d'IA	CSE	2400	10 000	24 000 000	4 passages sur 5 fermes/Localités/an
Sous Total (II)				78 850 200	
III- Vulgarisation des espèces fourragères sélectionnées					
3.1- Atelier de formation des CSE en production fourragère (mise en place de pâturage, entretien, récolte, conservation)	Nombre	2	2 141 700	4 283 400	120 CSE x pendant 6 jours/ 2 ans
3.2- Ateliers de sensibilisation et de formation des agro-éleveurs	Nombre	4	2 141 700	8 566 800	100 agro éleveurs pendant 6 jours/ an
3.3- Appui à l'approvisionnement en semences des agro éleveurs	H/mois	3	3 600 000	10 800 000	1 mission/ localité /an
Sous Total (III)				23 650 200	
IV- Vulgarisation des résultats de la recherche					
4.1 Mise en oeuvre transfert de connaissance (FEAP : Ferme-Ecole)	Nombre	120	100 000	12 000 000	2 passages/Localité/an sur 5 fermes
4.2 Suivi de la mise en œuvre de l'innovation introduite		120	100 000	12 000 000	4 passages/Localité/an sur 5 fermes
Sous Total (IV)				24 000 000	
TOTAL COMPOSANTES I+II+III+IV				209 920 400	
V. GESTION DU PROJET					
5.1 Etude de faisabilité	H/mois	2	4 000 000	8 000 000	
5.2 Suivi- Evaluation	H/mois	1,5	4 000 000	6 000 000	
5.3 Appui à l'exécution du projet	H/mois	2	4 000 000	8 000 000	
Sous Total (V)				22 000 000	
TOTAL GENERAL				231 920 400	

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 05/2005 - 2006
Intitulé du projet : PROJET DE FORMATION DES ELEVEURS	
1. Orientation	<i>Améliorer la production des ruminants (viande et lait)</i>
2. Objectifs	Professionaliser les éleveurs de ruminants
3. Description de l'état actuel	- Les projets de formation étatiques sont interrompus - Le FDFP finance quelques projets de formation - Beaucoup d'éleveurs n'ont pas accès à la formation
4. Contraintes	- La contribution financière des éleveurs aux frais de formation
5. Population bénéficiaire	- Eleveurs de ruminants
6. Stratégie de Mise en œuvre	- Analyse en besoin de formation - Mettre en place une équipe pluridisciplinaire
7. Actions passées ou en cours	- Projet PAEO, RPR, BAD Elevage, CNO, ANADER - Ecoles et centre d'élevage, Ranchs et APROCASUDE
8. Activités proposées	- Conduite à l'élevage des ruminants - Gestion Technico - Economique - Gestion coopérative
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- A déterminer
12. Partenaires	-
13. Coût prévisionnel	- 171 000 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	- Néant
15. Source de financement	- FIRCA
16. Charges récurrentes	- A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- Un atelier de planification participative est organisé sur 3 thèmes à l'attention de 16 OPA et ONG
- 3 voyages d'études sont organisés en Côte d'Ivoire avec 6 participants par voyage
- 2 voyages d'études sont organisés à l'étranger avec 5 membres de groupements par voyage
- Les éleveurs participent au SARA et à d'autres foires

FILIERE RUMINANTS					
Projet N° 05/2005-2006 : Formation des éleveurs					
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCFA)	Observations
I. Missions et réunions préparatoires (a)					16 Groupements, ONG, Collectifs...
I.1 Missions et réunions préparatoires	Nombre	16	500 000	8 000 000	Associations et coopératives identifiées
Sous Total (I)				8 000 000	
II. Atelier de planification participative(b)					3 ateliers pour les 3 thèmes
II.1 Prestation modérateur	Nombre	3	3 000 000	9 000 000	
II.2 Frais d'organisation (restauration, hébergement...) ©	Nombre	3	5000000	15 000 000	
Sous Total (II)				24 000 000	
III. Echanges entre groupements, séminaires					
III.1 Voyages d'études en CI (d)	Nombre	3	4 000 000	12 000 000	10 représentants pour 6 jours/voyage
III.2 Voyages d'études à l'étranger €	Nombre	2	20 000 000	40 000 000	5 représentants/groupements
III.3 Organisation et participation aux foires : SARA, etc, (f)	Nombre	5	15 000 000	75 000 000	
Sous Total (III)				127 000 000	
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				159 000 000	
IV. GESTION DU PROJET					
4.1 Etude de faisabilité	H/M	1	4 000 000	4 000 000	
4.2 Suivi- évaluation	H/M	1	4 000 000	4 000 000	
4.3 Appui à l'exécution du projet	H/M	1	4 000 000	4 000 000	
Sous Total (IV)				12 000 000	
TOTAL GENERAL				171 000 000	
OBSERVATIONS :					
a) Le nombre de groupement identifiés (ONG, Coopératives, Collectifs, d'élevages, etc...) est de 16,					
b) le nombre d'ateliers de planification participative est de trois (3) ateliers pour trois (3) thèmes :					
"conduite d'élevage des ruminants"					
"gestion technico-économique,"					
"et gestion coopérative,"					
c) Pour la participation aux ateliers, il est prévu quatre (4) représentants/ groupements pendant trois (3) jours soit un total de 64 éleveurs,					
d) Pour les voyages d'études en Côte d'Ivoire, il est prévu dix (10) représentants/ groupements et la durée du séjours est de six (6) jours,					
e) le nombre de voyages d'études à l'étranger est de deux (2) pour cinq (5) représentants/ groupement et la durée du séjour est de six (6) jours					
f) Le nombre de foires à organiser est de 5					

FIRCA	
Programme des Ruminants 2005-2006	
Code action : Ruminants 2005-2006	Projet : 06/2005 - 2006
Intitulé du projet : PROJET D'APPUI AU FINANCEMENT DES ELEVAGES DE RUMINANTS	
1. Orientation	<i>Améliorer la production des ruminants (viande et lait)</i>
2. Objectifs	- Amélioration de la production
3. Description de l'état actuel	- Quelques lignes de crédits existent au niveau de : BAD Elevage, Projet lait sud, PADER Lac, PADER Est....
4. Contraintes	- Les éleveurs ne sont pas capables de rembourser un crédit avec un taux d'intérêt > 9%
5. Population bénéficiaire	- Eleveurs de ruminants
6. Stratégie de Mise en œuvre	- Mise en place d'une équipe pluridisciplinaire - Organisation des états généraux sur l'élevage des ruminants
7. Actions passées ou en cours	- Fonds sociaux – clé à main - PAEO – BAD Elevage – Projet Lait Sud – PADER – GTZ (Eco-Ferme)
8. Activités proposées	- Mettre en place un mécanisme de gestion des prêts
9. Durée d'exécution	- 2 ans
10. Maître d'ouvrage	- FIRCA
11. Maître d'œuvre	- A déterminer
12. Partenaires	-
13. Coût prévisionnel	- 215 000 000 Francs CFA
14. Impact sur l'environnement	- Néant
15. Source de financement	- FIRCA
16. Charges récurrentes	- A déterminer

Indicateurs de réalisation :

- Une étude sur la compétitivité des élevages de ruminants est réalisée
- Une étude sur la mise en place d'un fonds de garantie est réalisée
- Un mécanisme de gestion des prêts est mis en place et est opérationnel
- Des états généraux sur l'élevage des ruminants sont organisés
- Des contrôles de labo sont réalisés sur la Brucellose, la Tuberculose, la Péripleurite Contagieuse Bovine, etc...
- 2 campagnes de vaccinations sont organisées

FILIERE RUMINANTS						
Projet N° 04/2005-2006 : Appui au financement des élevages de ruminants						
Composantes, Sous composantes et Activités	Unités	Quantités	CU(FCFA)	CT(FCFA)		
I. Missions et réunions préparatoires						
1.1 Intervention par région administrative et géographique	mission	4	1 000 000	4 000 000		
Sous Total (I)				4 000 000		
II. Etude sur le financement de la filière " ruminants"						
2.1 Recensement et synthèse des études réalisées	h/mois	1	4 000 000	4 000 000		
2.2 Etude sur la compétitivité des élevages de ruminants	h/mois	4	4 000 000	16 000 000		
2.3 Etude sur la mise en place d'un fonds de garantie	h/mois	2	4 000 000	8 000 000		
2.4 Mise en place d'un mécanisme de gestion des prêts	h/mois	2	4 000 000	8 000 000		
Sous Total (II)				36 000 000		
III. Organisation des états généraux sur l'élevage des ruminants						
3.1 Honoraires des prestataires	H/mois	2	4 000 000	8 000 000		
3.2 Frais d'organisation	forfait	1	5 000 000	5 000 000		
Sous Total (III)				13 000 000		
IV. Appui aux groupements de défense Sanitaire (GDS)						
4.1 Contrôle de labo sur la Brucellose, la Tuberculose, la Péripleurite Contagieuse Bovine, etc...	Nombre	320	250 000	80 000 000		
4.2 Organisation de campagnes de vaccinations	nombre	2	28 000 000	56 000 000		
Sous Total (IV)				136 000 000		
TOTAL COMPOSANTES I+II+III				189 000 000		
V. GESTION DU PROJET						
5.1 Etude de faisabilité	H/mois	0,5	4 000 000	2 000 000		
5.2 Suivi- évaluation	H/mois	3	4 000 000	12 000 000		
5.3 Appui à l'exécution du projet	H/mois	3	4 000 000	12 000 000		
Sous/total V				26 000 000		
TOTAL GENERAL				215 000 000		
TOTAL GENERAL						
OBSERVATIONS						
a) Le nombre de groupement identifiés (ONG, Coopératives, Collectifs d'élevage, etc.) est de 16,						
b) Le nombre de missions et de réunions préparatoires est de 4 à raison d'une (1) mission par zone géographique en regroupant les régions administratives en 4 zones						
c) Pour l'étude , on procédera au recensement et à la synthèse des études réalisées sur le sujet. Il est prévu l'intervention d'un (1) docteur vétérinaire sur un (1) h/mois,						
d) Pour l'organisation des états généraux, il est prévu cinq (5) représentants/ groupement pendant (3) jours soit un total de 80 éleveurs et environ 100 participants,						
e) Pour la mise en place d'un fonds de garantie, une ligne de crédit doit être créée dans une institution bancaire,						
f) Dans la gestion du projet il est prévu :						
* la réalisation d'une étude sur la compétitivité des élevages de Ruminants qui fait intervenir deux (2) consultants (1 docteur vétérinaire et 1 économiste) pour une durée de 2 mois,						
* le fonctionnement de la cellule de gestion des prêts pour un coût unitaire forfaitaire de 1 000 000 francs CFA/groupement d'éleveurs						
* Appui aux groupements de défense sanitaire par la réalisation des contrôles de laboratoire sur certaines maladies telles que la Brucellose, la Tuberculose, la Péripleurite Contagieuse Bovine, la Peste des Petits ruminants à raison de 20 interventions/ groupement d'éleveurs sur deux (2) ans et l'appui à l'organisations des campagnes de vaccinations des ruminants (Peste des petits ruminant, Péripleurite Contagieuse Bovine, Charbon symptomatique, Pasteurellose, Dermatose Nodulaire Contagieuse Bovine et fièvre aphteuse)						
* le suivi -Evaluation externe concerne 2 visites de terrain/an pour (1) consultant avec rédaction d'un rapport,						
RECOMMANDATIONS :						
Toutes les activités transversales de gestion du projet peuvent être effectuées en commun,						

Annexe 7 : Liste des participants

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURES ET FONCTIONS	ADRESSES / CONTACTS
1	SILUE LACINA	Collectif des éleveurs du Nord (SCGEAN) Président	05 40 03 10 BP 43 Dikodougou
2	Mr SORO SEHELO	Collectif des éleveurs du Nord Eleveur Ovins - Caprins	BP 144 Dikodougou 07 33 53 96
3	SIALOU KOFFI C.	Coopérative Marché Bétail de Toumodi CMBT	BP 55 Toumodi Cel. : 07 87 76 93
4	KPANGNI EMOLO	MRS S/DR	20 21 85 03
5	Dr KONE SALIOU	Cabinet PRIVET Ferkessédougou	Tél. : 22 41 71 41 05 03 45 54
6	Dr KOUAO BROU J.	CNRA Chef de Programme	BP 31 Bongerville 22 40 30 32 : 05 81 61 57
7	Dr YAPI BOKPE C.	Directeur Centre National Ovin (CNO)	Tour B, 1 ^{er} Etage Porte 17: 07 72 23 64/ 05 67 40 72
8	KONAN KOUAKOU	APEMC	05 62 47 60
9	Dr KONE KARIDJATOU	BNETD Chef Secteur Ressources Animales	04 BP 945 Abidjan 04 22 48 35 61
10	ACHI NDJA LUCIEN	Vice Pdt APROCASUDE	07 60 77 00 / 22 48 61 03 APROCASUDE
11	AYEMOU FIRMIN	APROCASUDE Technicien	16 B.P 328 Abidjan 16 07 60 12 69
12	ODIACHO E. ABRAHAM	APROLAIT SUD Eleveur Laitier	BP 96 Azaguié 07 79 97 32
13	TRAORE DAOUDA	ANADER – Siège Chef de cellule Etudes	BP V 183 Abidjan 05 60 53 28
14	KOFFI KOUADIO	Projet Laitier Sud Trésorier	BP 96 Azaguié 07 84 63 97

Annexe 7 (suite): Liste des participants

N°	NOMS ET PRENOMS	STRUCTURES ET FONCTIONS	ADRESSES / CONTACTS
15	SAMIN KOUAKOU	Formateur CAPP/Bingerville Ex- centre de Formation des éleveurs	05 87 35 32
16	GERARD O. KOUAKOU	Ecole d'Elevage Zootechnicien (Enseignant)	BP 58 Bingerville 22 40 30 36 / 05 90 96 32
17	KPAUCAHAN K. VENANCE	Promoteur élevages Ingénieur zootechnicien	22 52 26 38 07 89 19 02 27 BP 36 Abidjan 27
18	OSSEINI BOURAÏMA	FIRCA Conseiller Technique	22 82 51 94 07 09 25 55
19	KOUASSI K. JOSEPH	MINAGRI : DOPA	22 42 59 29 / 05 74 65 61
20	Dr CISSE BAKARY	LANADA, Chef de Laboratoire	04 BP 612 Abidjan 04 20 22 58 38 / 07 81 07 10
21	BAMBA KASSOUM	Fédération des éleveurs du Nord - FEDEK	BP 1171 Korhogo 05 96 91 30
22	Mme FADIGA Née D. HAÏDA	DPE / Chef de Service	20 21 68 63 / 07 44 25 03
23	Mr NANTCHIA ESSOUAN	DPP Chargé d'Etudes	05 57 38 07
24	KEITA BRAHIMA	Marché à Bétail de Boundiali (MBB), Inspecteur	A/G Mr TANO BASSARA Président du MBB
25	COULIBALY ABIBATA	Usine Nord-Lait Korhogo Secrétaire	05 31 51 78 B.P 703 Korhogo

Annexe 8 : Programme de l'atelier

Horaire	Activités	Travaux en :
Mardi 11/08/04		
8h 00 – 10h 00	- Ouverture : Allocution introductive - Présentation des participants - Présentation de la méthodologie - Analyse des concernés	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café-cacao	
10h 30 – 12h 00	- Analyse des problèmes : o Introduction o Brainstorming, classification o Identification Problème central o Identification des effets	Plénière
	- Identification des causes directes	Plénière
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des sous - causes (niveau 1)	Groupes
	- Analyse des problèmes : Restitution	Plénière
	- Analyse des objectifs : exposé	Plénière
	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes	Groupes
16h 00 – 16h 30	Pause café-cacao	
16h 30 – 18h 00	- Analyse des objectifs : Travaux de groupes (suite)	Groupes
	- Analyse des objectifs : Restitution	Plénière
Mercredi 12/08/04		
	- Choix des alternatives de programme/projets	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Elaboration du cadre logique : o Objectif global, Objectifs spécifiques, Résultats.	Plénière
	o Identification des activités principales	Groupes
	o Identification des Indicateurs Objectivement Vérifiables, Sources de Vérification et Hypothèses importantes.	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café-cacao	
10h 30 – 12h 00	- Identification des activités : (groupes suite)	Groupes
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Identification des activités Restitution	Plénière
16h 00 – 16h 30	Pause café-cacao	
16h 30 – 18h 00	- Identification des indicateurs	Groupes
Judi 13/08/04		
	- Choix des projets prioritaires pour les deux prochaines années	Plénière
	- Identification des indicateurs : Restitution	Plénière
8h 00 – 10h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets (introduction)	Plénière
10h 00 – 10h 30	Pause café-cacao	
10h 30 – 12h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
12h 00 – 14h 30	Pause déjeuner	
14h 30 – 16h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
16h 00 – 16h 30	Pause café-cacao	
16h 30 – 18h 00	- Eléments de rédaction des fiches projets	Groupes
18h 00	- Allocution de clôture	Plénière
